

国道140号（山梨新環状道路東部区間1期）舗装工事

（小曲町30工区）

日頃より、山梨新環状道路建設工事に伴いご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。現在、当工事においては仕上げの舗装工事を施工しております、大型車両も頻繁に往来していて、地域の皆様には何かとご迷惑をお掛け致しております。騒音・振動・交通安全等に細心の注意を払い施工を進めてまいります。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

工期	令和2年10月22日から令和3年9月30日
工事概要	アスファルト舗装工事 L=200m・A=3900㎡
進捗状況	76.6%（令和3年6月末日時点）



甲府市朝日二丁目13番4号

TEL： 055-253-8211

FAX： 055-253-8229

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期） 道路改良工事（一部債務）（余フ）

地域の皆様におかれましては日頃より、工事へのご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

本工事は、重力式擁壁工を行い、補強土壁及び盛土工事へと移っていきます、本格的な夏に突入していきますが、安全第一で一日でも早い完成を目指してまいります。

皆様方には何かとご迷惑をおかけしておりますが引き続き、ご理解とご協力のほどよろしく申し上げます。

工 期 : 令和2年12月25日～令和3年12月20日


工 事 概 要 : 道路改良工事

(本線部) L=389m 盛土工V=7300m³ 地盤改良工V=1800m³

補強土壁工A=103m² 踏掛版工一式

(県道部) L=122m 排水構造物工L=238.6m

工 事 進 捗 率 : 6月末時点 31.0%

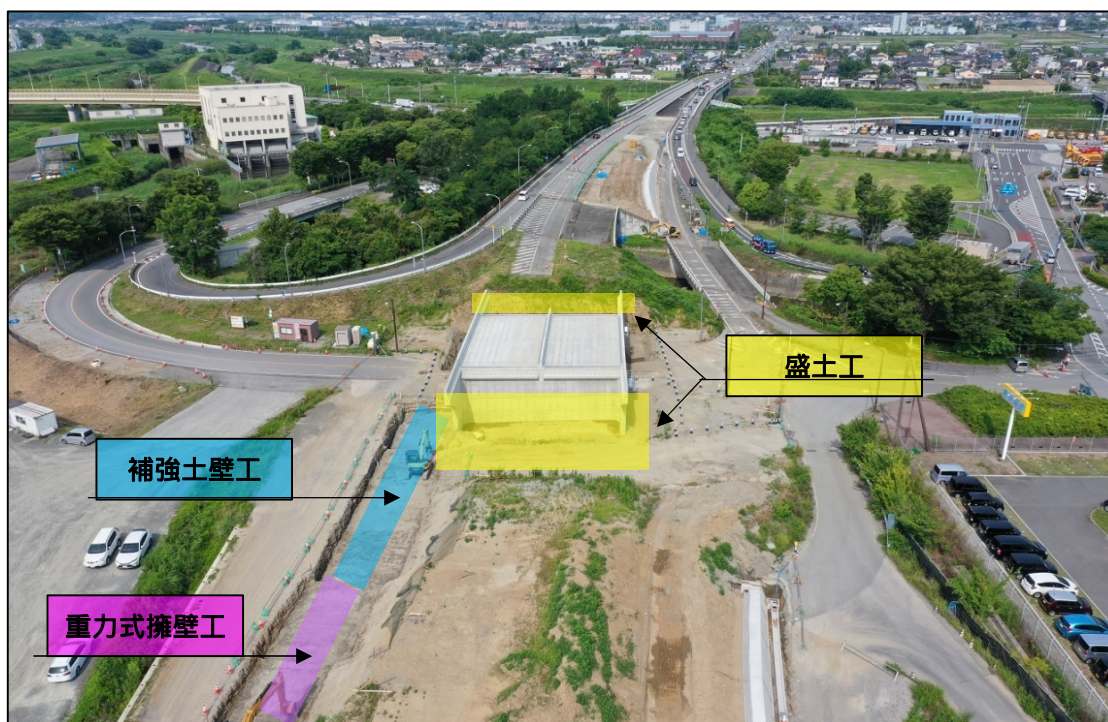

至南アルプス

至石和

施 工 会 社 :  大新工業株式会社

山梨県甲府市太田町7番1号

055-233-5518

現場代理人 源川雅之




国道140号（新山梨環状道路東部区間1期） 橋梁工事（一部債務）

平素より新山梨環状道路建設工事に当たり、皆様方のご理解ご協力ありがとうございます。
ございます。

現在、A1橋台 既製杭工事が完了し引き続き躯体工の床掘りを行います。
工事期間中は地域住民の皆様には何かとご迷惑をおかけいたしますが安全第一
で早期完成を目指してまいります。引き続き、ご理解・ご協力をお願い致します。

工 期 : 令和3年3月3日～令和4年1月31日

工事概要 : 複合門形ラーメン橋 1基
L=17.0m W=19.14m (18.25m)
橋台工N=1基 (H=7.4m W=20.0m)
鋼管杭 (φ600) N=26本
道路改良工 L=130.1m
盛土工 V=6950m³

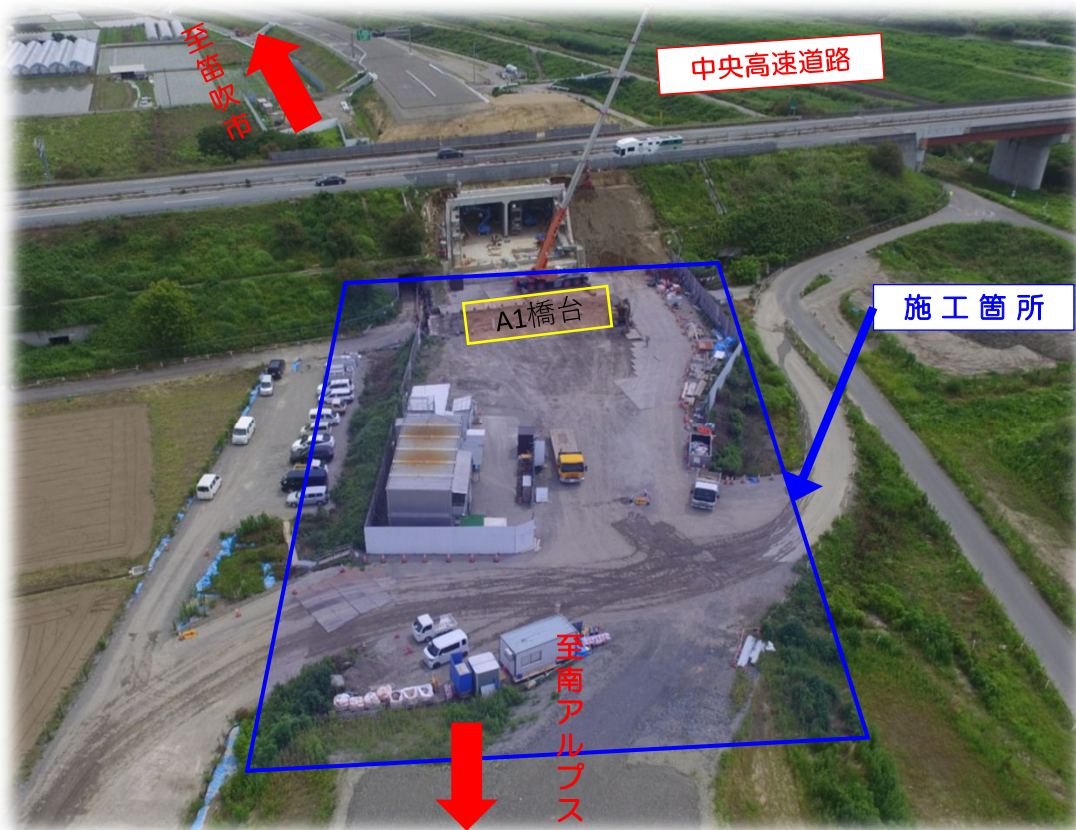

5S+1 運動実施中

施工会社

 国際建設株式会社

山梨県甲府市塩部4丁目15番5号
TEL : 055-251-2111 (代表)
FAX : 055-254-7822



現場代理人 小林 新吾

監理技術者 里吉 進志

令和2年度 国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 道路改良工事(明許)(2補)

日頃より、地域住民の皆様には、工事へのご協力をいただき感謝いたします。
本工事は、ボックスカルバート1基と環状道路本線の路体盛土を施工する道路改良
工事です。

6月末時点では、既設構造物の撤去が完了しており、来月から掘削・地盤改良を
行っていきます。地域のご協力のもと、安全第一で工事完成を目指します。

R3.6月末撮影

至
南
アル
プ
ス
↑



↓
至
石
和

工 期 : 令和3年3月24日～令和4年2月25日
工 事 概 要 : 道路改良工事 L=141m
盛土工 V=14,100m³
カルバート工 1基 (B=7.9m×H=4.4m×W=23.8m)
工事進捗状況 : 6月末時点 7.0%



大新工業株式会社

山梨県甲府市太田町7-1
☎055-233-5518

現場代理人・監理技術者
清水 信



国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 気象観測装置設置工事(明許)(2補)

地域の皆様におかれましては、日頃より新山梨環状道路建設工事にあたりご理解ご協力をいただき誠にありがとうございます。現在、気象観測装置設置工事につきましては工場にて各種機器類の製作・調整を行っております。

安全第一で、環境に配慮した工事が行えるよう取り組んでまいります。工事期間中はご不便ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。



工事概要：気象観測装置設置

(雨雪量計・風向風速計・通風式気温計・路面放射温度計)

工期：令和3年3月17日～令和3年12月24日

工事進捗率：15%



施工者：(株)甲斐電設

現場代理人：上野正樹




風向風速



路面放射温度計
路面状態セン

雨雪量計
通風式気温



国道140号（新山梨環状道路東部区間1期） 道路改良工事その1（明許）（2補）

平素より新山梨環状道路建設工事へのご理解とご協力を賜りまして誠に有難う御座います。本工事は5月中旬より施工が着手致しまして、東側の本線法面の防草シートの施工が完了し、現在は西側本線法面の法尻防草ブロックを順次施工を行っております。地域への皆様方には何かとご不便ご迷惑をおかけすることもございますが、安全第一で工事の早期完成を目指しますので、引き続きご協力宜しくお願い申し上げます。


施工範囲



防草シート 施工済み



施工横断面図（側道）

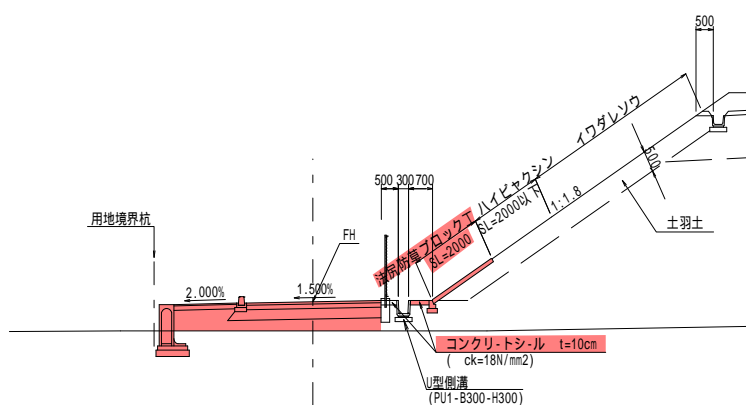

工事概要

道路改良工 L=773m
 法尻防草ブロック工 A=1,569㎡
 排水構造物工 L=182m
 舗装工（下層路盤） A=3,724㎡

工期

令和3年3月24日～令和3年12月24日

工事進捗率

22.3%（6月末時点）

請負会社

中沢工業株式会社
 山梨県甲府市幸町9-24
 055-233-4801



現場代理人 長嶺 裕二

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期） 法面植栽工事（明許）（2補）

地域の皆様には、日頃から工事へのご理解とご協力をいただきありがとうございます。

本工事は現在、植栽作業を進めております。7月にかけては引き続き植栽工事を行う予定でおります。

工事中はご不便をおかけすることもございますが、安全第一で工事の完成を目指してまいります。引き続きご協力よろしくお願い申し上げます。

工期：令和3年 3月 17日～令和3年 8月 20日

工事概要：法面植栽工事

植生工 A=550m² 植栽工 N=2880本

工事進捗率：6月末時点 60.0%



植栽工

施工会社：一葉園

山梨県山梨市上岩下569

☎0553-22-0022

現場代理人 山田亮一

国道140号（新環状道路東部区間） 道路改良工事（一部債務）（余フ）

日頃より環状線建設工事へのご協力ありがとうございます。
現在は、赤色エリアのランプ盛土工事を施工していて、もう少で
工事完成です。つきましては施工に際して騒音・振動・道路規
制等皆様にご不便ご迷惑等をおかけすると思いますが極力騒音振
動等抑えるよう努力致します、なにとぞご理解ご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。



工 期 : 令和2年3月31日～令和3年8月20日

工事概要 : (仮称)落合ランプ設置工 L = 72.0m W = 7.00m～9.25m
盛土工 V = 4,300m³ 水路カルバート工 L = 60m
舗装工（下層路盤）A = 2,300m²
交差点改良 L = 173m W = 17.1m
排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式

株式会社 三枝組

現場代理人 加藤 善 磨

