

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期） 橋梁工事（一部債務）

（小曲町35工区）

平素より新山梨環状道路建設工事に当たり、皆様方のご理解ご協力ありがとうございます。

8月末現在、排水構造物工・ブロック張工の施工が完了し、立入防止柵を設置しています。設置完了後、工事完成となります。

工事期間中は地域住民の皆様には何かとご迷惑をおかけいたしますが安全第一で早期完成を目指してまいります。引き続き、ご理解・ご協力をお願い致します。

工 期：令和3年3月3日～令和4年9月30日

工事概要：複合門形ラーメン橋 1基
L=17.0m W=19.14m (18.25m)
橋台工N=1基 (H=7.4m W=20.0m)
鋼管杭 (φ600) N=26本

道路改良工 L=130.1m
盛土工 V=6950m³

令和3年3月（着工前）



令和3年11月末時点



令和4年4月末時点



令和4年8月末時点



施工会社



国際建設株式会社
安全に・より良く・より早く

山梨県甲府市塩部4丁目15番5号
TEL：055-251-2111（代表）

FAX：055-254-7822

現場代理人・監理技術者 里吉 進志

5S+1運動実施中



国道140号(新山梨環状道路東部 区間1期)舗装工事その2(明許)

日頃より、地域の皆様には環状道路工事へのご理解・ご協力を誠にありがとうございます。

現在は、ICTを活用し本線及び西下条ランプの上層路盤工を完了し、9月からは、舗装工事を行っていきます。

工事中は、近隣住民の皆様には何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で完成を目指していますので、引き続きご理解とご協力をお願い致します。



施工範囲



↑
至
笛吹市

↓
至
南アルプス市

現在進捗状況



工 期 : 令和 4年 1月 26日 ~ 令和 4年 10月31日

工事概要 : 舗装工

排水性舗装(本線)L=165.7m・W=17.2m~17.4m・A=3,020m²

アスファルト舗装(ランプ部)L=259.0m・W=5.4m~5.6m・A=1,440m³

工事進捗率 : 8月末時点 55%

施工会社



山梨県甲府市大里町2141番地1

T E L : 055-241-8250


F A X : 055-241-8251

現場代理人: 内田信也

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期） 安全施設設置工事その3（明許）

平素より新山梨環状道路建設工事へのご理解とご協力を賜りまして誠に有難う御座います。本工事は、現在法肩工を施工中であります。地域への皆様方には何かとご不便ご迷惑をおかけすることもございますが、安全第一で工事の早期完成を目指しますので、引き続きご協力宜しくお願い申し上げます。

施工範囲

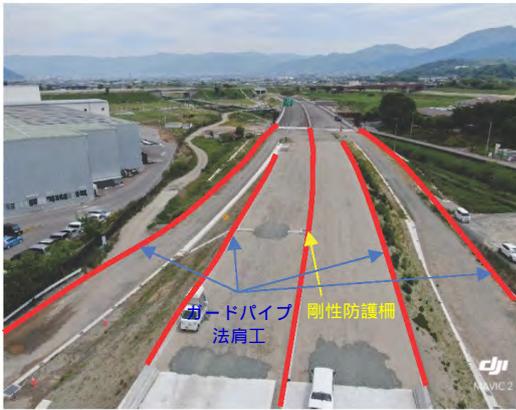


法肩工（2型）



典肩工（2型）施工手順



施工横断図（側道）

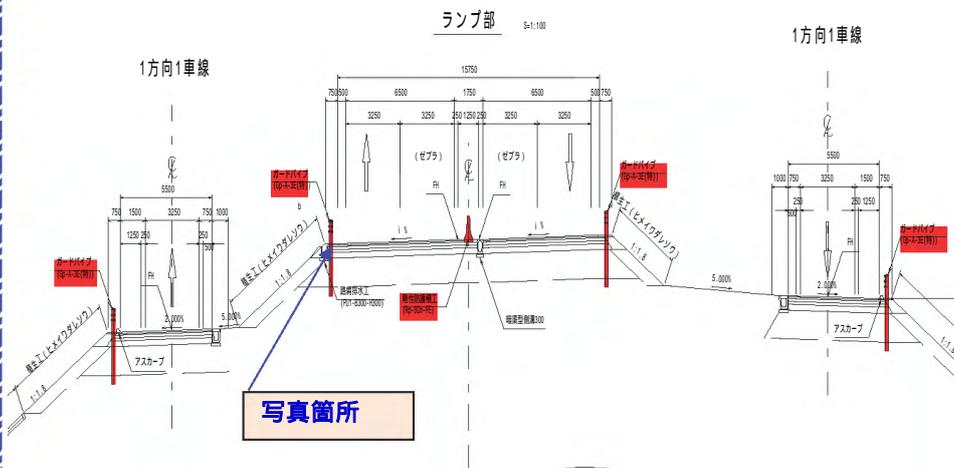

工事概要

- 防護柵工
- ガードパイプ L=468m
- ガードレール L=43m
- 剛性防護柵 L=147m
- 落下防止柵 L=53m

法面工

法肩工 A=406m²

道路付属施設工

1式

工期

令和4年1月28日～令和4年10月31日

工事進捗率

30.20%（8月末時点）

請負会社

中沢工業株式会社
山梨県甲府市幸町9-24
055-233-4801

現場代理人 長嶺 裕二

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期） 遮音壁設置工事その3（明許） （小曲町55工区）

地域住民のみなさまにおかれましては、日頃より工事へのご協力頂きありがとうございます。
ございます。

本工事は、環状道路本線及びランプ部に遮音壁の設置を行っています。現在は、
土工部の遮音壁が完了し、残る作業は橋梁部の遮音壁設置となります。

工事施工中、地域住民の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力
のほど、よろしくお願いいたします。



工 期 : 令和4年2月14日～令和4年10月31日
工 事 概 要 : 遮音壁工（橋梁部） L=329m、H=1.0m
遮音壁工（土工部） L=206m、H=2.0m
工事進捗率 : 8月末時点 44.9%



齋藤建設株式会社

現場代理人 : 前川 直樹

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）植栽工事その4（明許）
（小曲町59工区）

日頃より、地域の皆様には工事へのご理解、ご協力を頂きありがとうございます。本工事は道路東側法面部に防草シートを設置し、植栽を行う工事です。

現場は、最後に落合ランプ部の防草シートを設置し植栽作業を行って行く予定です。

工事中はご迷惑をおかけ致しますが、引き続きご理解、ご協力をお願い申し上げます。



工 期 令和4年2月28日～令和4年9月30日

工事概要 防草シート設置 1920㎡

イワダレソウ植栽 3780㎡

思いをかたちに

株式会社 帯金造園

山梨県甲府市池田2-11-12

☎055-251-4128

現場代理人・主任技術者 小鷹 忍

国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 舗装工事その3(全部債務)(小曲町60工区)

日頃より、新山梨環状道路建設工事へのご理解・ご協力、誠にありがとうございます。
ございます。

本工事は、本線及び管理用通路の舗装工事を行います。

近隣の皆様及びご通行の皆様にはご不便、ご迷惑をおかけしておりますが、
ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工 期	:	令和4年3月23日～令和4年11月30日
工 事 概 要	:	舗装工 排水性舗装(本線) A=4579m ² アスファルト舗装(管理用通路) A=1770m ²
進 捗 率	:	令和4年8月末時点 7.59%



日東建設株式会社

山梨県甲府市朝日2-13-4
TEL055-253-8211

現場代理人 保坂直樹

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期） 側道舗装工事（全部債務）

日頃より新山梨環状道路東部区間の建設工事にご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。
順調に作業を行わせていただき、着々と側道工事が完成してきております。
近隣の皆様及びご通行の皆様には、ご不便、ご迷惑をおかけしておりますが、引き続き、振動・粉塵には十分配慮して安全第一で完成を目指してまいりますので何卒ご協力をお願いいたします。

現場現況状況



工 事 概 要 : アスファルト舗装工 車道部 : $A = 4350\text{m}^2$
歩道部 : $A = 1160\text{m}^2$

縁石工 $L = 145\text{m}$

区画線工 $L = 1550\text{m}$

工 期 : 令和4年3月22日～令和4年10月31日

工 事 進 捗 率 : 78.3%

会 社 名 : 丸吉工業有限会社 現場代理人 前田幸仁



国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）区画線工事（全部債務）

日頃より、新山梨環状道路建設工事へのご理解・ご協力を賜りましてありがとうございます。
現在、区画線工事におきましては他工事との調整を行いながら進めております。

9月上旬から写真工区の施工を予定しております。

工事中はご不便、ご迷惑をおかけしますが引き続き、ご理解とご協力のほどよろしく
お願い致します。

工 期 : 令和4年3月22日～令和4年9月30日

工 事 概 要 : 区画線工 L=8,604m
車線分離標 N=192本

工事進捗率 : 12%（令和4年8月末）

会 社 名 : 株式会社ロード 甲府市下小河原町262番地 055-241-6161

現場代理人 : 阪野 浩史



国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)区画線工事

日頃より、新山梨環状道路建設工事へのご理解・ご協力を賜りましてありがとうございます。現在、区画線工事におきましては他工事との調整を行いながら進めております。これからも共用に向け、沿線の皆様にご迷惑をかけないよう安全第一で作業を行いますので、宜しくお願い致します。

工 期 : 令和4年3月18日 ~ 令和4年11月30日

工 事 内 容 : 区画線工 5,364m
薄層カラー舗装 176㎡
車線分離標 34本
簡易中分ブロック 192個

進 捗 率 : 23%(令和4年8月末現在)

会 社 名 : 協和産業株式会社 甲府市丸の内2-7-16 055-226-3435

現 場 代 理 人 : 小笠原 健次



【本線部】

区画線、車線分離標、簡易中分ブロック設置



【ランプ部】

区画線、薄層カラー舗装設置



【県道部】

区画線設置

国道140号（新山梨環状道路東部区間）

道路改良工事（明許）

日頃より地域の皆様には工事へのご理解・ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。

7月中旬から落合ランプ法面の法尻防草ブロックの施工に着手し、現在は全て完了しております。

8月下旬から落合ランプの排水構造物及び残りの縁石を順次施工してまいります。

近隣の皆様方には何かとご不便、ご迷惑をおかけしますが、安全第一で早期完成を目指してまいります。引き続き、ご理解とご協力のほど宜しくお願い致します。



工 事 概 要 : 道路改良工事 L=856m

(本線部) 平ブロック張工A=460m² 排水構造物工L=638m
踏掛板V=43m³

(県道部) 排水構造物工L=113m 縁石工L=186m
迂回路工一式

工 期 : 令和3年11月18日～令和4年12月23日

工 事 進 捗 率 : 47.4% (8月末現在)



人と暮らしを守っていきたい。
宏和建設株式会社

現場代理人 大久保裕史

国道140号（新山梨環状道路東部区間）道路照明設置工事その2(明許)

平素より新山梨環状道路建設工事へのご理解とご協力を賜りまして誠にありがとうございます。

現在、照明基礎の設置が完了しており、照明柱の建中を行っております。9月上旬に本線上の配管・配線工事を行う予定です。

これから照明工事も佳境に入っていきますので、引き続き変わらぬご理解・ご協力をお願い致します。

道路照明設置状況（落合西ランプ）



工事概要 道路照明設置 N=16基
函渠照明設置 N=6基
視線誘導灯設置 N=1基
電光標識設置 N=1基

工 期 令和4年2月3日～令和4年10月31日

進 捗 率 75%（8月末時点）

会 社 名 協和産業株式会社
山梨県甲府市丸の内2-7-16 TEL 055-226-3435

現場代理人 水上 修

国道140号（新山梨環状道路東部区間）標識工事その2（明許） 落合11工区

平素より新山梨環状道路建設工事へのご理解とご協力を賜りまして誠にありがとうございます。

本工事は本線部、ランプ部、県道部の道路標識を設置する工事となりますが、現在までに大型標識本柱建込、小型標識基礎工を進めております。

工事中はご不便、ご迷惑をおかけしますが引き続きご理解・ご協力をお願い申し上げます。



【工事概要】 大型標識 N=3基、小型標識 N=16基

【工期】 令和4年3月7日～令和4年10月14日

【進捗率】 55%（8月末日時点）

【受注者】 協和産業株式会社

山梨県甲府市丸の内2-7-16〔TEL 055-226-3435〕

国道140号（新山梨環状道路東部区間）舗装工事その4（明許）（2補）
落合14工区

日頃より、新山梨環状道路建設工事へのご理解、ご協力ありがとうございます。

本工事は、落合西ICの本線部、ランプ部及び県道部の舗装工事を行っています。

住民の皆様及びご通行の皆様にはご不便、ご迷惑をお掛けしておりますが、安全第一で作業を進めていきますのでよろしくお願いいたします。

工 期 : 令和4年3月29日 ~ 令和4年11月30日

工 事 内 容 : 舗装工


排水性舗装 L=95m W=25.4~34.8m A=2,692m²

アスファルト舗装 L=703m W=1.62~10.5m A=4,294m²

透水性舗装 L=183m W=3.2~3.25m A=529m²

橋面防水工 A=2,842m²

進 捗 率 : 令和4年8月末時点 25.13%

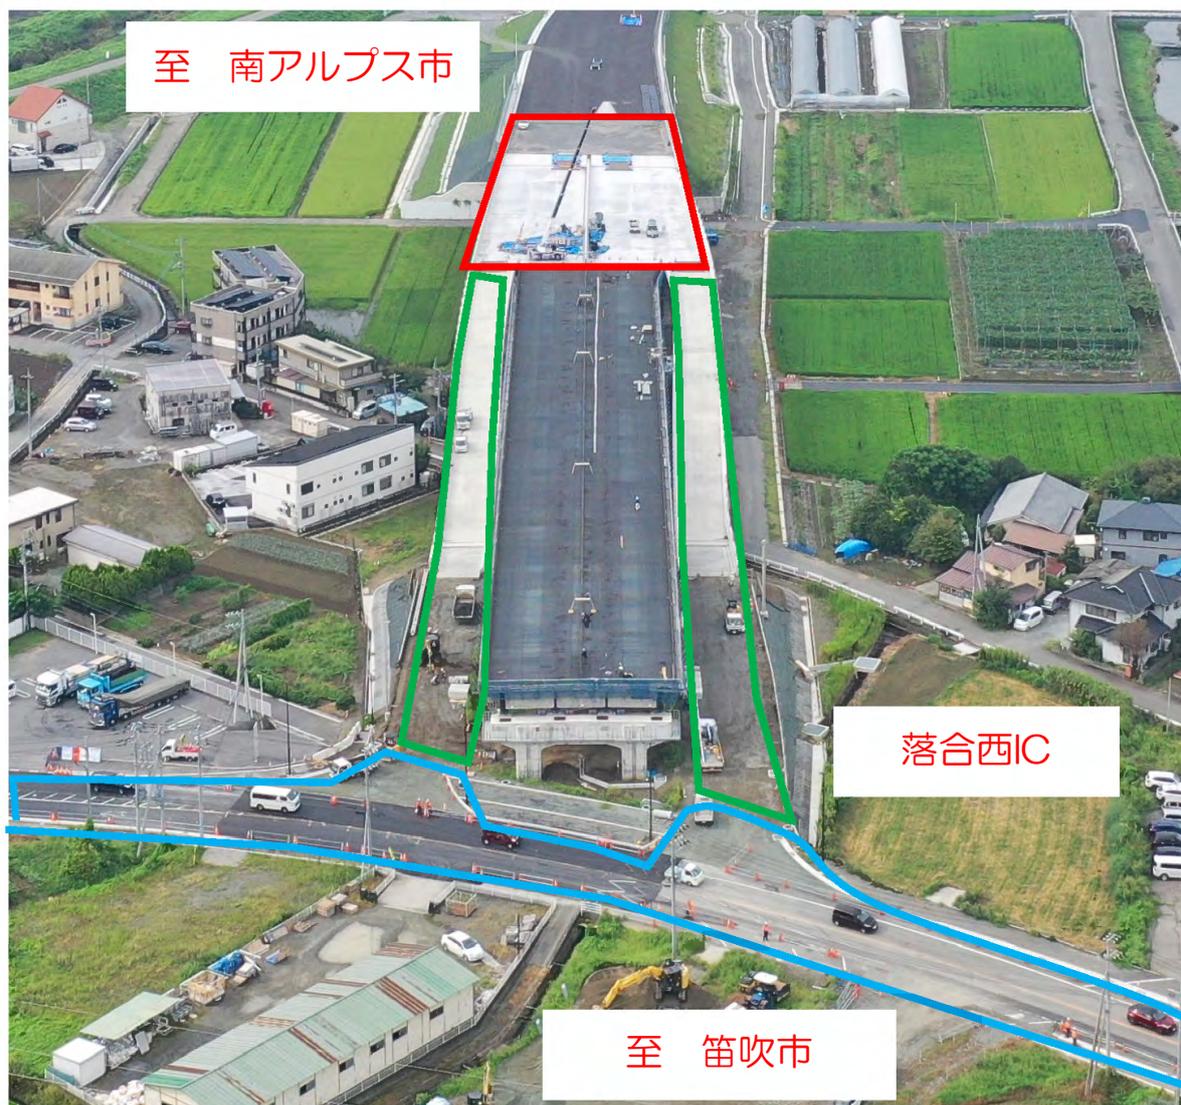

株式会社 早野組
山梨県甲府市東光寺1-4-10
055-235-1111

現場代理人 雨宮 洋平

国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)標識工事

日頃より、新山梨環状道路建設工事へのご理解・ご協力を賜りましてありがとうございます。現在、標識工事におきましては施工に先立ちまして、作業の下準備及び標識支柱・板の製作を進めており、7月末より本施工を行います。これからも沿線の皆様にご迷惑をかけないよう安全第一で作業を行いますので、宜しくお願い致します。

工 期 : 令和4年3月9日 ~ 令和4年11月30日

工 事 内 容 : 大型案内標識撤去・設置 3基

進 捗 率 : 51%(令和4年8月末現在)

会 社 名 : サンコーライン株式会社 昭和町清水新居357 055-228-3641

現場代理人 : 植松 史郎

【施工箇所平面図】

