

国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 落合4号橋(仮称)上部工製作・架設工事(一部債務)

地域の皆様におかれましては、日頃より新山梨環状道路建設工事の施工に当たり、ご理解ご協力をいただき誠にありがとうございます。


作業状況は、床版工の合成床版パネルの架設が完了しました。
残作業は足場の解体作業を行い、現場作業は完了となります

地域の皆様には、工事にご不便をおかけすることもあるかと存じますが何卒ご協力をお願いいたします。

現場位置図



現場施工状況

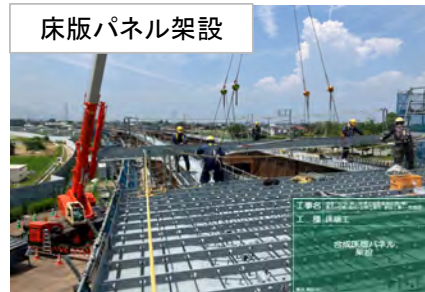

床版設置完了



橋形式：鋼4径間連続細幅箱桁橋

橋 長：188.000m

支間長：42.400m+43.000m+51.000m+50.400m

全幅員：9.620m～13.890m

桁 高：2.100m

工 事 概 要：鋼橋工場製作工、鋼橋架設工、合成床版工
橋梁附属物工、仮設工

工 期：令和5年12月19日～令和7年12月19日

施 工 者：横河ブリッジ・飯田鉄工 共同企業体

工 事 進 捗 率：95.9%（令和7年8月末時点）

現場代理人・監理技術者 佐藤 健 （株）横河ブリッジ

監理技術者 遠藤 洋 飯田鉄工(株)

国道140号（新山梨環状道路東部区間2期） 落合1号橋（仮称）上部工製作・架設工事（一部債務）

地域の皆様におかれましては、日頃より新山梨環状道路建設工事の事業推進に当たり、ご理解ご協力をいただき誠にありがとうございます。

本工事は夜間で道路上の合成床版の架設を行い、橋長200m全ての架設が完了しました。9月からは現場塗装の作業を行う予定です。

工事に当たりましては、安全第一と周辺環境への配慮を図り、早期完成を目指して取り組んでまいります。地域の皆様には、工事にご不便やご迷惑をおかけすることがあるかと思いますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

施工状況(夜間架設)




施工状況(架設完了)



橋梁諸元

橋形式：鋼4径間連続合成少数鈑桁橋
橋長：200.0m
支間長：48.3+51.0+51.0+48.3m
全幅員：9.52m
桁高：2.70m(標準部)
総鋼重：約364t(橋桁のみ)

断面図

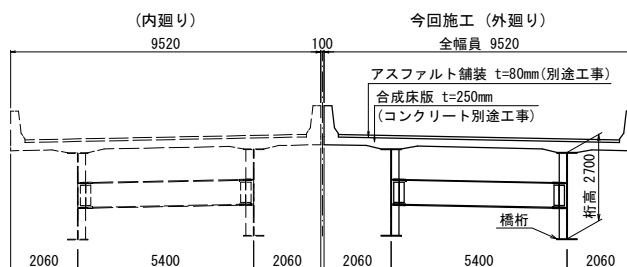

【工事概要】 鋼橋工場製作工、鋼橋架設工、合成床版架設工、巻立てコンクリート工
橋梁附属物工、仮設工

【工期】 令和6年3月22日～令和7年11月28日

【工事進捗率】 94.7% (令和7年8月末時点)

【施工者】 飯田鉄工・檜崎製作所 共同企業体

現場代理人・監理技術者 飯田鉄工(株) 岡 道也
監理技術者 (株)檜崎製作所 佐藤 有悟



国道140号（新山梨環状道路東部区間2期） 落合3号橋（仮称）上部工事（一部債務）（余フ）（補特）

地域の皆様におかれましては、日頃より新山梨環状道路建設工事に当たり、ご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。

本工事は、令和7年9月中旬頃より、工場製作した橋桁を現地で架設するための準備作業を開始し、随時架設作業を実施していく予定です。

また、工事に当たりましては、環境への配慮と安全第一を図り、早期完成を目指して取り組んでまいります。地域の皆様には、工事中にご不便をおかけすることもあるかと存じますが何卒ご協力をお願いいたします。

現場位置図



現場状況



工事概要：鋼橋工場製作工、鋼橋架設工、橋梁附属物工、仮設工

橋梁形式：鋼6径間連続合成鈹桁橋

橋 長：210.000m

桁 長：209.750m

支間長：30.400+4@37.000m+30.400m

全幅員：9.620m

工 期：令和6年3月27日～令和8年3月13日

工事進捗率：令和7月8月末時点 72.1%

施工者： 高田機工・飯田鉄工 国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）

落合3号橋上部工事共同企業体

現場代理人・監理技術者

辻井 愛也

高田機工株式会社

監理技術者

澤田 浩伸

飯田鉄工株式会社

国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 落合5号橋(仮称)上部工製作・架設工事(一部債務)

地域の皆様におかれましては、日頃より新山梨環状道路建設工事の施工に当たり、ご理解ご協力をいただき誠にありがとうございます。

本工事は現在、工場にて橋桁製作を行っており、令和7年9月より現場工事を行う予定です。

また工事施工に当たりましては、環境への配慮と安全第一を図り早期完成を目指して取り組んでまいります。

地域の皆様には工事中ご不便をおかけすることもあるかと存じますが何卒ご理解ご協力をお願いいたします。

現場位置図



工場製作(塗装完了)



橋形式：3径間連続非合成鋼細幅箱桁橋
橋 長：158.000m
支間長：51.400m+54.000m+51.300m
全幅員：9.620m～11.031m
桁 高：2.100m


工 事 概 要： 鋼橋工場製作工、工場塗装工、鋼橋架設工、
合成床版架設工、現場塗装工、橋梁附属物工、仮設工
工 期： 令和6年10月15日～令和8年6月26日
施 工 者： 三井住友建設鉄構エンジニアリング・飯田鉄工 共同企業体
工 事 進 捗 率： 52.4% (令和7年8月末時点)

現場代理人：小園 淳 三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)
監理技術者：加瀬 清治 三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)
辻 賢一 飯田鉄工(株)



国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）道路 工事その1（一部債務）（余フ）

日頃より皆様の工事へのご理解・ご協力を頂きまして、厚く御礼申し上げます。
工事に当たっては、ご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払って行います。
作業中ご迷惑をおかけする場合もございますので、何卒、ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

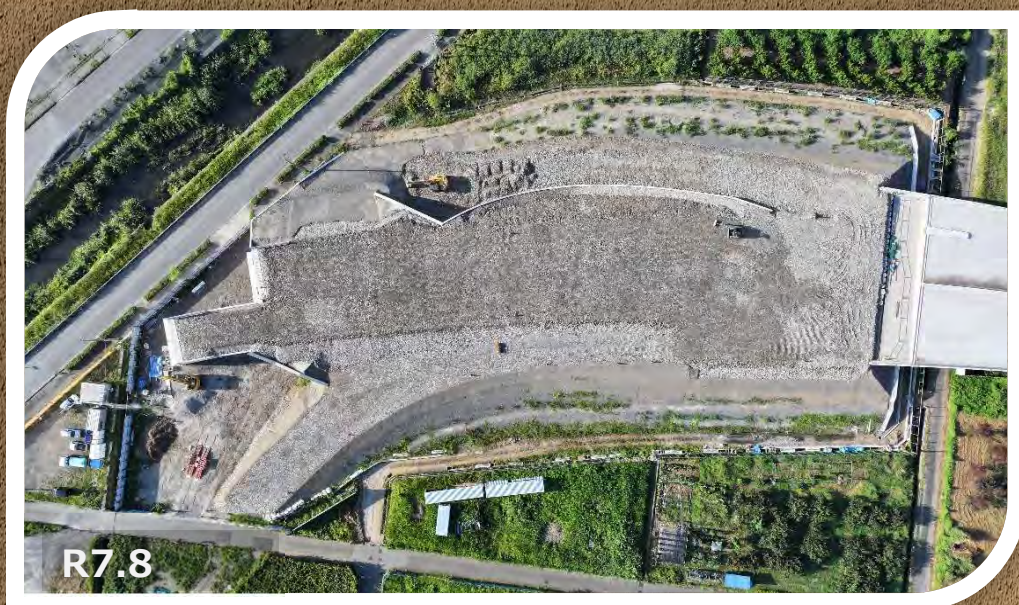

環状線本線の盛土工が完了し、
側道（管理用通路）の施工を
行います。

道路改良工 L=149.3m
路体盛土 V=43,300m³ 路床盛土
V=5,600m³
中層混合処理 V=2,039m³
補強土壁工 L=113m A=466m²
コンクリートブロック積 一式
排水構造物工 一式
仮設工 一式
工事進捗率 令和7年8月末 89.1%



株式会社 芦沢組土木

現場代理人
監理技術者

望月 万久
塩島 誠

国道140号（新山梨環状道路東部区間2期） 道路工事その2(一部債務)

日頃より新山梨環状道路建設工事にあたり、皆様のご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

現在の作業状況は片付け作業を行っており、全体の99%が完了しました。

9月中旬に現場作業所を撤退し、工事完了となります。

皆様には何かとご不便、ご迷惑をおかけしましたが
ご理解とご協力ありがとうございました。



工事内容

- ・道路改良工(構造物の基礎部分) 延長 593m
- 地盤改良工(中層混合処理工)
- 改良量(体積) 36,698m³

工事期間：令和8年3月15日迄

工事進捗率：99%(令和7年8月31日現在)

現場代理人：植草 大樹

担当者：主任技術者：雨宮 晴彦

監理技術者：植草 大樹

国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 唐柏1号橋下部工事(一部債務)(余フ)

日頃より新山梨環状道路建設工事にあたり、地域の皆様のご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

現在の進捗状況は、橋脚躯体の最終コンクリート打設に伴う作業になります。

これからも、安全第一と周辺環境に配慮した作業を行っていきます。

工事施工中にはご不便やご迷惑をお掛け致しますが、工事の無事故・無災害での早期の完成を目指してまいります。



石和西小学校



〇工事概要

橋梁下部工 (P21~P25)

張出式橋脚 N=5基 H=6.6~7.3m

V=732m³

場所打杭 (φ1500) L=30.0~36.5m

N=20本

工期 令和6年9月3日~令和7年12月19日

工事進捗率 令和7年8月末時点 94.0%



現場代理人・監理技術者兼務
株式会社 飯塚工業

佐藤 信輔



工事中につき
大変、ご迷惑を
おかけしております



道を



飯塚工業

国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 道路工事(一部債務)

日頃より、新山梨環状道路（東部区間）の建設にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

施工は順調に進んでおり、現在は東エリアにて擁壁工事及び盛土工事を施工しています。

今後も東西両エリアを並行して施工していきます。

工事期間中はご不便ご迷惑をお掛けすることもあるかと存じますが、何卒ご協力をお願い致します。

【現況写真】



【工 期】 令和6年9月17日 から 令和8年3月13日

【工事概要】 路体盛土工 V=31,500m³
路床盛土工 V=2,500m³
地盤改良工（φ1600） L=7.3m～9.2m N=330本
擁壁工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式

【工事進捗】 令和7年8月末時点 82.8%

早野組・望月組土木共同企業体

現場代理人・監理技術者

(株)早野組 町田恭一郎

山梨県甲府市東光寺1-4-10

