

国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 落合5号橋床版工事(一部債務)

地域の皆様におかれましては、日頃より新山梨環状道路建設工事の施工にあたり、ご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、甲府市落合町地内において新山梨環状道路東部区間の整備に伴い、橋上のコンクリート部を構築する工事(床版工事)を施工しております、国際建設株式会社でございます。

本工事では8月中に全てのコンクリートの打設を終え、現在は、地覆工(壁高欄)の施工を行っております。完成に向けて大まかな工事の流れは、地覆工(橋両端部の壁)のシール工事後、足場の解体を行い施工完了予定です。

工事の実施にあたりましては、引き続き環境への配慮と安全確保に万全を期し、早期完成に向けて取り組んでまいります。

地域の皆様には、工事期間中ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

工事施工箇所



壁高欄工施工状況



工 事 概 要

工事内容：橋梁上部工(鋼3径間連続非合成細幅箱桁橋)

橋長L=158.0m 幅員W=7.0(8.5)m

合成床版工 コンクリートV=367.0m³

伸縮装置工 L=19.0m

鋼製排水溝 L=153.0m

壁高欄工 L=312.0m

仮設工 1式

8月末進捗率

94.70%

※赤字は施工完了工種

工事期間： 令和8年2月4日 ～ 令和8年9月25日

工事従事者：現場代理人・監理技術者 渋谷 敏洋



国際建設株式会社

山梨県甲府市塩部4丁目15番5号

TEL: 055-251-2111 (代表) FAX: 055-254-7822

国道140号（新山梨環状道路東部区間2期） 道路工事（一部債務）（余フ）26工区

日頃より皆様の工事へのご理解・ご協力を頂きまして、厚く御礼申し上げます。
工事に当たっては、ご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払って行います。
作業中ご迷惑をおかけする場合もございますので、何卒、ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

ICTバックホウによる
法面整形作業状況



ICT重機による敷均し
転圧作業状況



工事名	国道140号（新山梨環状道路東部区間2期） （余フ）26工区（一部債務）
工種	路床盛土工
測点	工事用道路（7～3工区）
5層目 土砂運搬 敷均し・転圧 作業状況	

工事用道路・路床盛土工
5層目完了（路床厚1.0m）



※ICT土工

ICT重機による法面整形・敷均し・転圧
作業を行っています。

道路改良工	L=239m
路体盛土工	V=9.900m ³
路床盛土工	V=1.900m ³
ブロック積工	A=141.0m ²
排水構造物工	L=927m
剛性防護柵工	L=439m
踏掛版	V=344m ³

工事進捗率

令和8年8月末 17.0%



株式会社 声沢組土木

現場代理人
監理技術者


小尾 剛

国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 笛吹高架1号橋下部工事その1(一部債務)(余フ)(補特)

日頃より新山梨環状道路建設工事にあたり、地域の皆様のご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

現在の進捗状況は、地盤改良が終わり。橋台の基礎となる場所打杭工に着手しました。これからも、安全第一と周辺環境に配慮した作業を行っていきます。

工事施工中にはご不便やご迷惑をお掛け致しますが、工事の無事故・無災害での早期の完成を目指してまいります。

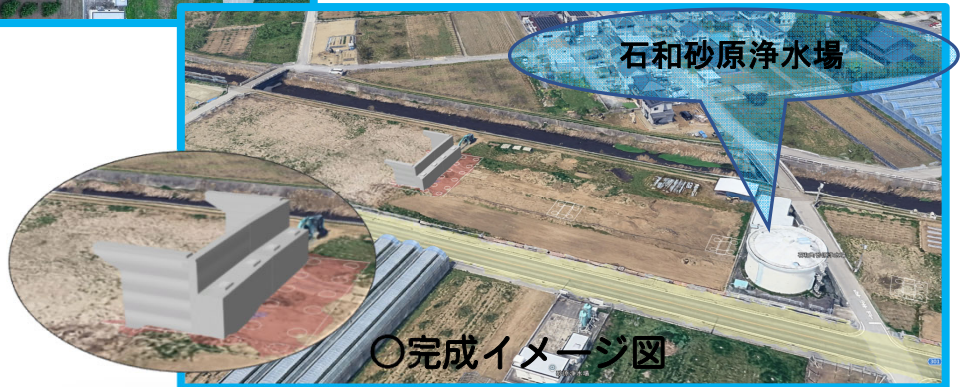

〇工事概要

橋梁下部工

逆T式橋台 N=1基 H=10.38m V=1,047m³

場所打杭φ1,500 L=53.5m N=24本

仮設工 一式

工期 令和 8年5月11日～令和 9年 10月6日

工事進捗率 令和8年8月末時点 18.2%

只今工事中



現場代理人・監理技術者兼務
株式会社 飯塚工業

佐藤 信輔



工事中につき
大変、ご迷惑を
おかけしております



道を



飯塚工業


国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 笛吹高架1号橋下部工事その2(一部債務)(余フ)(補特)

地域の皆様におかれましては、平素より新山梨環状道路の建設工事に際し、多大なるご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

本工事は、砂原浄水場付近において3基の橋脚を築造するものです。6月中旬に着工し、現在は場所打杭工を進めております。

工事期間中、地域の皆様には何かとご不便やご迷惑をおかけいたしますが、安全第一で施工に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【令和8年8月末 作業状況】

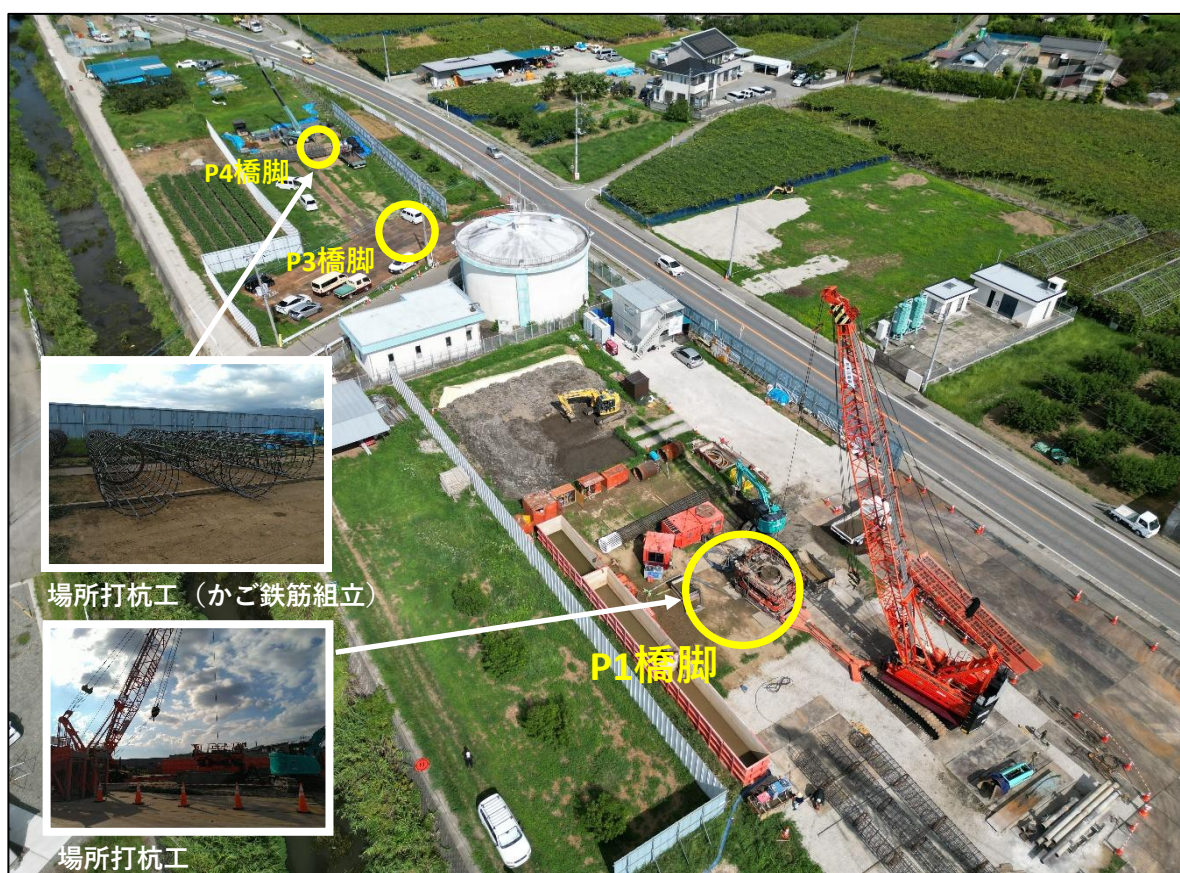

工事概要：橋梁下部工 張出式橋脚 N=3基 H=7.3～8.1m V=532m3
場所打杭 $\Phi 1,500$ L=42.0～45.5m N=12本
仮設工 一式

工 期：令和8年3月27日～令和9年6月23日

工事場所：笛吹市石和町砂原4工区

進捗状況：26.5% (令和8年8月末)


施 工 者：株式会社 中村工務店 現場代理人・監理技術者 中村貴洋



国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 笛吹高架2号橋下部工事(一部債務)(余フ)(補特)

平素より、公共事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
新環状道路東部区間2期工事につきましても、皆様のご協力のもと、順調に進んでおります。
現在は、工事を安全に始めるための仮囲い及び場内の整備を進めています。

工事中は、工事車両の出入や騒音・振動などにより、近隣の皆様にはご不便・ご迷惑をおかけすることがあるかと存じますが、安全を最優先に作業を進めてまいります。

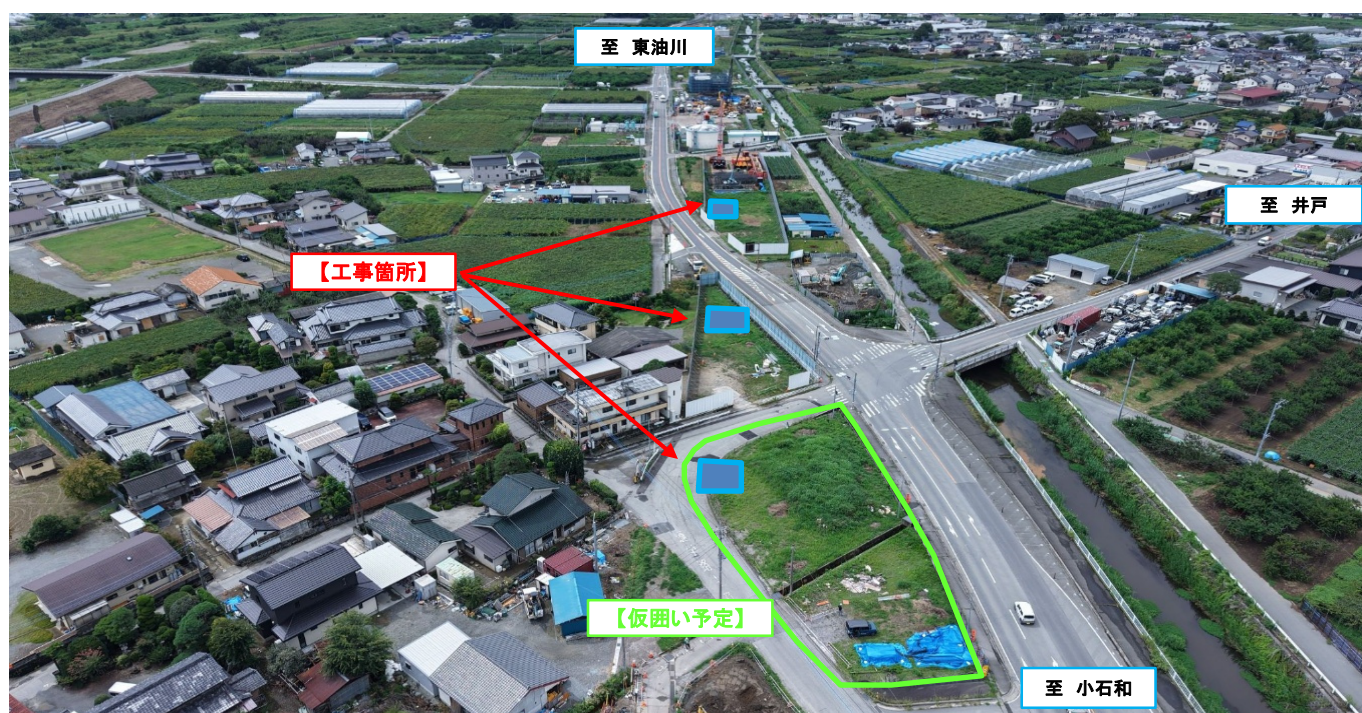

工事概要

橋脚下部工事(P5・P6・P7)

張出式橋脚 N=3基 H=8.5~9.4m V=699m³
場所打杭(φ1,500)L=40.5~42.0m N=14本
仮設工 一式

工期 令和8年 3月 26日~令和9年 11月 12日

工事進捗率 令和8年8月末現在 3.2%

現場代理人・監理技術者
兼務

株式会社 飯塚工業

根津 翔太



KK飯塚工業



国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 笛吹 高架10号橋下部工事(一部債務)(余フ)(補特)

地域の皆様におかれましては、日頃より新山梨環状道路建設工事の施工に当たり、ご理解ご協力をいただき誠にありがとうございます。

現在、水路工の施工をしています。水路の完成は10月中旬を予定しています。

水路工事と並行して9月下旬より橋脚工の施工を始める予定となっております。

工事に当たりましては、環境への配慮と安全第一で作業を進めて参ります。地域の皆様には、工事中にご不便をおかけすることもあるかと存じますが何卒ご理解ご協力をお願いいたします。



工事概要：ラーメン式橋脚 N=1基、場所打杭 (φ1,500) L=35.0m N=11本
水路工 L=221m、仮設工 一式

工期：令和8年3月30日～令和9年9月24日

工事進捗率：19% (令和8年8月末)

施工者：風間興業株式会社

住所 笛吹市八代町北1047-1

TEL 055-265-2353

現場代理人・監理技術者 風間 光陽



風間興業株式会社


国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 笛吹高架16号橋下部工事(一部債務)(余フ)(補特)

日頃より新山梨環状道路建設工事にあたり、皆様にはご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

現在は、橋脚の基礎となる場所打杭工事を行っています。

工事期間中は、皆様にご不便やご迷惑をおかけいたしますが、安全を最優先に工事を進めてまいります。

何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

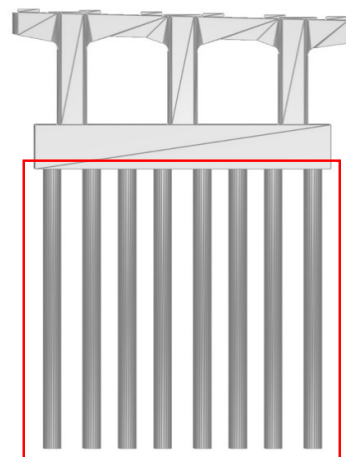

工 事 概 要 : 橋梁下部工(ラーメン式橋脚) N=1基 H=10.3m V=783m³

場所打杭工($\phi 1200$) L=19.0m N=24本

仮設工 一式

工 期 : 令和8年3月25日 ~ 令和9年11月12日

工事進捗率 : 34% (令和8年8月末時点)

施 工 者 : 風間興業株式会社

現場代理人・監理技術者 木俣 隆司



風間興業株式会社
