


国道140号（新山梨環状道路東部区間1期） 道路改良工事その1（一部債務）



日頃より、山梨県の道路事業にご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。
この度、甲府市小曲町地内にて新環状道路建設を行っております。

皆様の御理解と御協力のもと、工事の進捗も半分を超えました。今後においても、
車両の通行等、何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、工事関係者一同鋭意努力し、
騒音・災害防止・交通安全等に細心の注意を払う所存です。
どうぞよろしくお願い致します。

上空より撮影(令和2年8月27日現在)

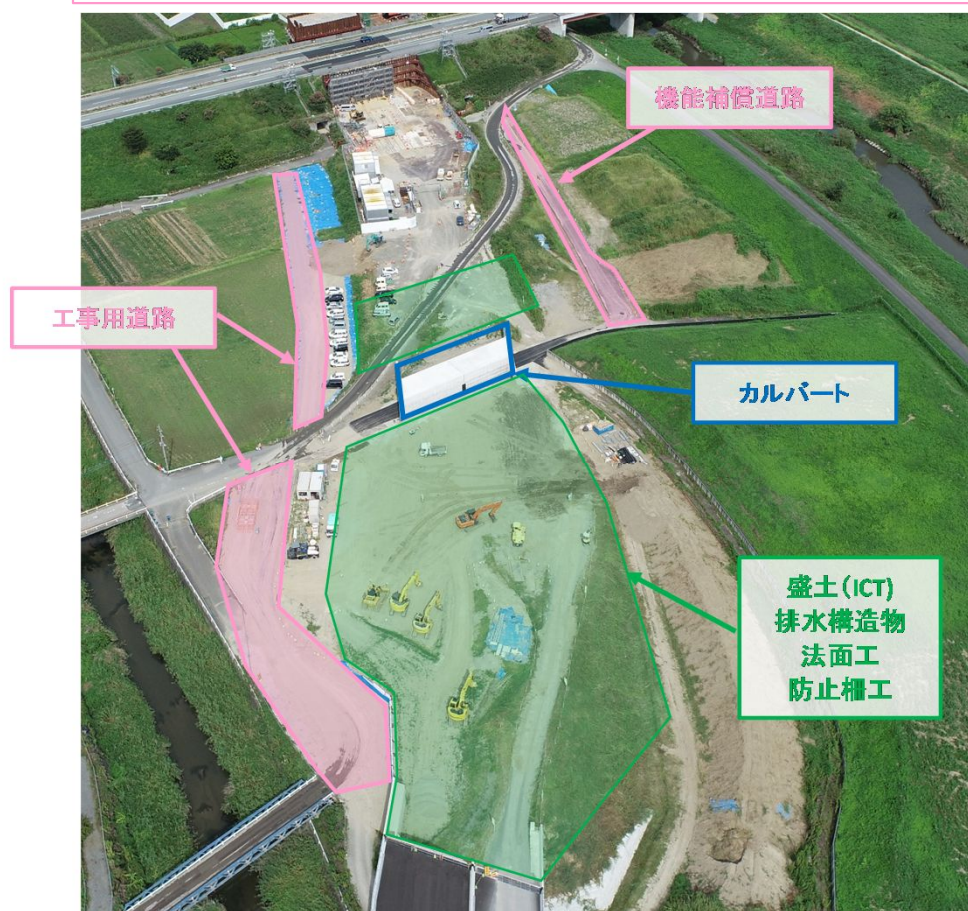

工期	:	令和元年 12月 24日	~	令和 3年 1月 20日
主な工事概要	:	路体盛土工 V=24,800m ³	路床盛土工 V=3,500m ³	
		地盤改良工 V=2,206m ³	補強土壁工 A=207m ²	
		カルバート工 n=1基	仮設工 一式	
工事進捗状況	:	令和 2年 8月末時点	59.0%	
受注者	:	株式会社 早野組		
		現場代理人 望月 慶介		



真心と確かな技術

株式会社

早野組

国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 道路改良工事その2(一部債務)

残暑厳しく、涼風の待たれるこの頃でございます。
季節の変わり目でもありますので地域の皆様方におかれましては
くれぐれも体調管理にはお気をつけください。

現在、当工事においては場所打函渠の作業が完了し、並行して付属の構造物
を築造しています。9月から本格的な盛土作業に入っていく予定です。
大型車両も頻繁に往来することになり、地域の皆様やご通行の皆様方には
ご不便、ご迷惑をお掛けすることがあるかと思いますが、安全第一で工事の
進捗を図って参りたいと思っておりますので、何卒ご協力のほどよろしくお願い
いたします。

【 上空からドローンにて現場を撮影 】



工事概要

道路改良工事 L=411m
盛土工 V=50,420m³
地盤改良工 V=5,392m³
補強土壁工 A=174m²
場所打函渠工 N=1箇所
仮設道路工 1式

工期

令和 1年12月24日
～令和 3年 3月15日

工事進捗率 39%(8月末時点)

 齋藤建設株式会社

山梨県甲府市青沼二丁目11-22 TEL 055-233-910 FAX 055-233-6382

国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 西下条本線橋(仮称) 橋梁工事 (一部債務)

平素より新山梨環状道路建設工事に当たり、皆様方のご理解ご協力ありがとうございます。

現在、A2橋台において場所打杭工事を行っています。
工事期間中は地域住民の皆様には何かとご迷惑をおかけいたしますが安全第一で早期完成を目指してまいります。
引き続き、ご理解・ご協力をお願い致します。

● 工事概要

プレテンション方式高強度PC床版橋 L=18.0m W=18.25m
逆T式橋台 N=2基 H=9.2m
場所打杭基礎 φ1200 L=31.5~32.0m N=34本

工 期 : 令和 2年 2月26日 ~ 令和 3年 3月15日

工事進捗状況 : 8月末時点 31.3%



施 工 会 社

国際建設・望月組土木 国道140号(新山梨環状道路)西下条本線橋工事共同企業体

国道140号（新環状道路東部区間） 道路改良工事（一部債務）（余フ）

日頃より環状線建設工事へのご協力ありがとうございます。
当現場はただいま準備中で 9月 中旬過ぎから付随する水道
工事の着手を予定してます、つきましては工事施工に際して
騒音・振動・道路規制等皆様にご不便ご迷惑等をおかけると
思いますが極力騒音・振動等抑えるよう努力致します、なに
とぞご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。



工 期 : 令和2年3月31日～令和3年3月15日

工事概要 : (仮称)落合ランプ設置工 L = 72.0m W = 7.00m～9.25m
盛土工 V = 4,300m³ 水路カルバート工 L = 60m
舗装工（下層路盤）A = 2,300m²
交差点改良 L = 173m W = 17.1m
排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式

株式会社 三枝組

現場代理人 加 藤 善 磨

