

2.評価シート（1）

（1）事業を巡る社会経済情勢等の変化

（今回の再評価で変更がある場合、変更事項を説明するために必要な内容）

①地域・住民の意向状況

R3年度末 用地契約済み（早期の歩道整備の要望あり）
 ※甲斐市通学路交通安全プログラム（H26）に位置付けられた対策必要箇所
 であり緊急性は高い

②産業・経済情勢

なし

③国等の方針

なし

④上位計画・関連事業計画等

「山梨県総合計画」（令和3年改定）
 「山梨県社会資本整備重点計画（第4次）」（令和3年3月改定）
 「山梨県道路の整備に関するプログラム」（令和3年3月改定）
 「甲斐市通学路交通安全プログラム」（平成27年）

⑤自然環境条件等

なし

⑥その他

なし

（2）評価時点の費用対効果分析

項目		着手時点		変更計画時点	
総事業費			百万円		百万円
工期		～		～	
評価基準年					
経済 効 率 性	費用		百万円		百万円
	建設費		百万円		百万円
	維持管理費		百万円		百万円
	その他(百万円		百万円
	便益		百万円		百万円
			百万円		百万円
			百万円		百万円
			百万円		百万円
	その他※		百万円		百万円
B/C					

※交差点改良事業であり、局所的な工事であるため費用便益比は不算出

（3）これまでの計画変更等の概要

用地取得に時間を要したため、計画期間を令和4年度まで延期した。
 （平成28年度変更内容）
 完成年度 当初：令和元年度 → 変更：令和4年度

評価シート(2)

<p>(4) 事業進捗状況及び見込み</p> <p>①進捗率 別表のとおり。 (現計画)100%→(実績)64.5%→(変更計画)64.5%</p> <p>②進捗率実績が計画と相違している理由 令和3年度末時点での用地契約率は100%であるが、支障物件の移転撤去が遅れており、工事着手にいたっていないことによる。</p> <p>③総事業費の変更内容</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">変更工種等</th> <th style="width:40%;">事業費増減</th> <th style="width:45%;">変更理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">百万円 増減</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">百万円 増減</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>④事業期間の変更理由及び進捗予定 支障物件の移転撤去が遅れていることにより、工事進捗が遅れているため、工期を3年延長し、令和7年度の完成を予定している。</p> <p>⑤今後の事業執行における留意点 交差点改良工事時に発生する信号移設に関して、交通管理者との事前調整。</p>	変更工種等	事業費増減	変更理由		百万円 増減			百万円 増減		合 計			<p>(5) 環境負荷等への配慮</p> <p style="text-align: center;">なし</p> <hr/> <p>(6) コスト縮減の可能性</p> <p style="text-align: center;">なし</p> <hr/> <p>(7) 代替案立案の可能性</p> <p style="text-align: center;">なし</p> <hr/> <p>(8) 所管部の今後の方針 継続・見直し継続・その他() (理由) 当該工区は、自動車交通量が多いにも関わらず、変則交差点となっており、大変危険な状況である。また、近接に中学校が位置しており、歩行者が多く、十分な歩道幅員が確保されていないことから、地元篠原地域からの事業推進の要望も強い。また、用地契約は100%であることから変更計画に基づき令和7年度の完成を予定している。</p>
変更工種等	事業費増減	変更理由											
	百万円 増減												
	百万円 増減												
合 計													

〇別表-進捗率(事業費ベース)

算出方法：【上段】現計画の計画事業費/総事業費×100 【中段】現計画の実績事業費/総事業費×100 【下段】変更計画の計画事業費/総事業費×100 単位：%


		年度	H25	H26	*H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	*R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
現	計画				2.5	20.0	25.8	35.5	47.0	64.5	82.0	100.0								
	実績				2.5	20.0	25.3	25.8	35.5	46.7	47.0	64.5								
	変更計画											64.5	82.0	97.0	100.0					

*事業着手年度又は評価年度


*R4年度の実績は見込み

3. 添付資料シート (1)

平面図

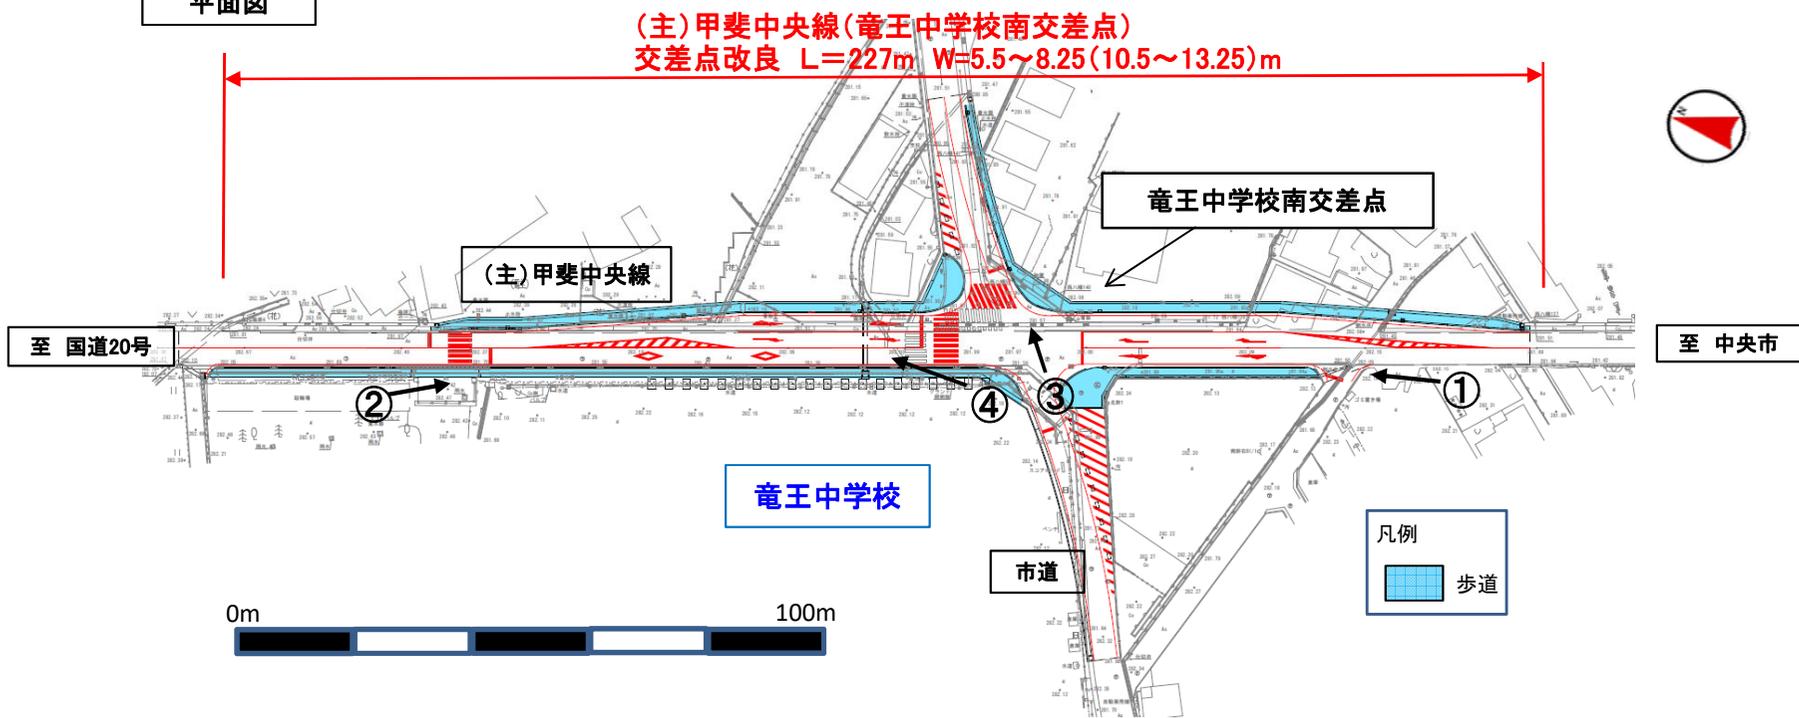

標準横断面

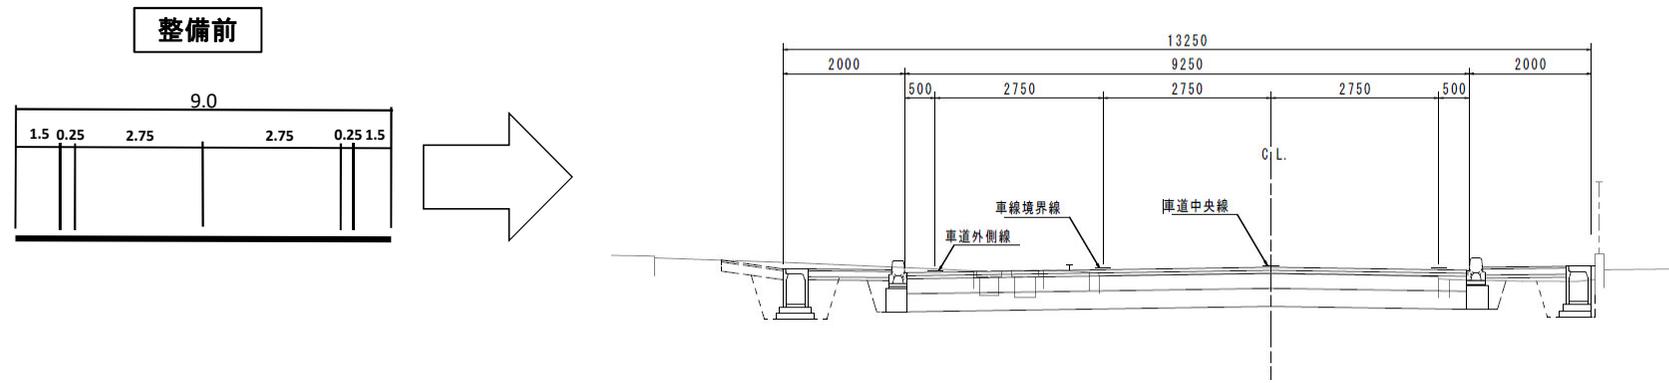

3. 添付資料シート (2)

①



交差点南より

②



交差点北より

③



歩行者通行状況

④



歩行者・通行車両状況

4.年度別事業費内訳表（変更計画の内容）

年度	変更事業費 (千円)	事業概要	進捗率 (%)
H27	10,000	測量・調査	2.5
H28	69,845	用地取得	20.0
H29	21,385	舗装工 L=76.5m、側溝工 L=151m	25.3
H30	1,989	舗装工 L=76.5m	25.8
R1	38,875	用地取得	35.5
R2	44,620	用地取得	46.7
R3	1,380	用地取得	47.0
R4	70,000	交差点改良工 L=100m	64.5
R5	70,000	交差点改良工 L=127m	82.0
R6	60,000	交差点改良工（舗装工） L=227m	97.0
R7	11,906	道路台帳修正	100.0
合計	400,000		
