

発行日：令和2年3月10日

# 新山梨環状道路通信

## ～2月 工事現場進捗状況～


資料提供 東部1期工区安全協議会  
NEXCO中日本(株)

新山梨環状道路は、甲府都市圏と周辺市町間の連結強化などを目的とした、全長約43kmの地域高規格道路です。

現在、新環状道路建設事務所では、西下条IC(甲府市小曲町)から(仮)広瀬IC(笛吹市石和町)までの東部区間(L=7.1km)の事業を進めています。

今回は、西下条IC(甲府市小曲町)から(仮)落合西IC(甲府市落合町)の東部区間1期(L=1.6km)の、工事の状況をお伝えいたします。  
※残りの東部区間2期(約5.5km)は現在、詳細設計及び地元との交渉を進めています。

### ～東部区間1期 全体概要図～

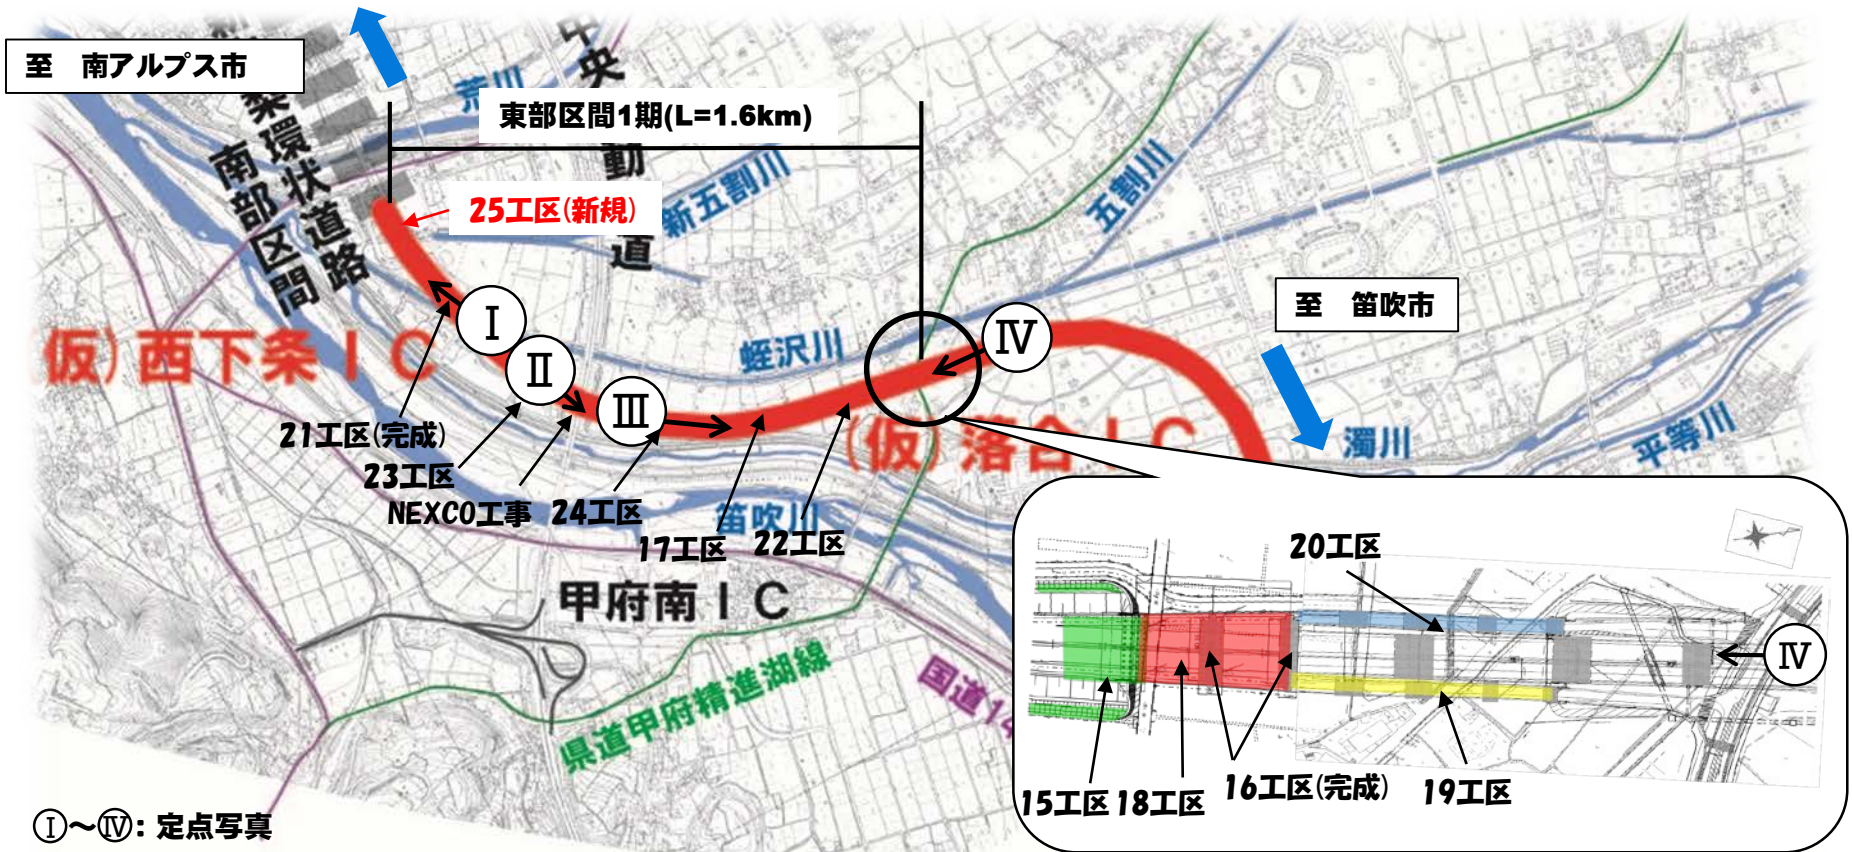

# 令和元年度 新山梨環状道路(東部区間1期) 工事一覧

工区番号	契約番号	工事名	工期	受注者	工区番号	契約番号	工事名	工期	受注者
15工区	道整18-0041	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)小曲高架橋(仮称)橋梁下部工事その1(一部債務)	2019/3/29 ~ 2020/4/30	雷藤建設(株)	22工区	道整19-0016	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)道路改良工事(一部債務)	2019/9/10 ~ 2020/11/13	長田組土木(株)
16工区	道整18-0042	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)小曲高架橋(仮称)橋梁下部工事その2(一部債務)	2019/3/29 ~ 2020/2/17	国際建設(株)	23工区	道整19-0037	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)道路改良工事その1(一部債務)	2019/12/24 ~ 2021/1/20	(株)早野組
17工区	道整19-0007	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)道路改良工事(一部債務)	2019/8/9~ 2020/8/28	大新工業(株)	24工区	道整19-0038	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)道路改良工事その2(一部債務)	2019/12/24 ~ 2021/3/15	雷藤建設(株)
18工区	道整19-0008	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)小曲高架橋(仮称)橋梁上部工製作・架設工事(一部債務)	2019/8/28 ~ 2020/12/15	飯田鉄工・榎崎製作所JV	25工区	道整19-0046	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)西下条本線橋(仮称)橋梁工事(一部債務)	2020/2/26 ~ 2021/3/15	国際建設・望月組土木JV
19工区	道整19-0009	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)落合西オンランプ橋(仮称)橋梁上部工建設工事(一部債務)	2019/8/9~ 2020/8/26	(株)早野組	NEXCO 工事	-	中央自動車道 甲府南地区函渠工事	2017/9/21 ~ 2020/3/27	鉄建建設大成ロテックJV
20工区	道整19-0010	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)落合西オフランプ橋(仮称)橋梁上部工建設工事(一部債務)	2019/8/9~ 2020/8/26	(株)三枝組					
21工区	環状19-0035	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)穂池大橋 舗装工事	2019/9/6~ 2020/2/28	地建工業(株)					

※R2.2.28時点 赤字：追加・変更(R1.1.15時点より)

～現場進捗状況写真～

2020年2月8日撮影

I

西下条IC付近



**21工区**  
2月8日時点は穂池大橋の橋面上の  
舗装施工中です。  
2月末、無事完成しました。

II

中央自動車道付近



**NEXCO工事**  
中央道の下にトンネルを作る工事です。  
現在、地下構造物(BOXカルバート)の製作  
中です。

III

中央道から小瀬方面



**17・22工区**  
環状道路下を通るためのBOX  
カルバートの工事をしています。  
完成後、盛土工事に移ります。

黒枠：将来形のルートイメージ  
赤枠：工事中箇所

IV

(仮)落合西IC付近



**15工区**  
引き続き、橋台工事をしております。

**19・20工区**  
ランプ部に橋桁を作るための足場と型枠を  
作っています。  
橋の位置がイメージできます。
