


令和元年9月度 工事進捗状況のお知らせ

(仮称)落合西ランプ安全協議会

平素、皆様におかれましては、日頃より公共事業に御協力いただきまして、誠にありがとうございます。
平成31年1月より工事を着手しまして、皆様の御協力により橋梁下部工事が進んでおります。
この度、各工事の進捗状況を皆様にお伝えしたく、月1回程度工事状況をお伝えします。
引き続き、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

R1.9月末撮影

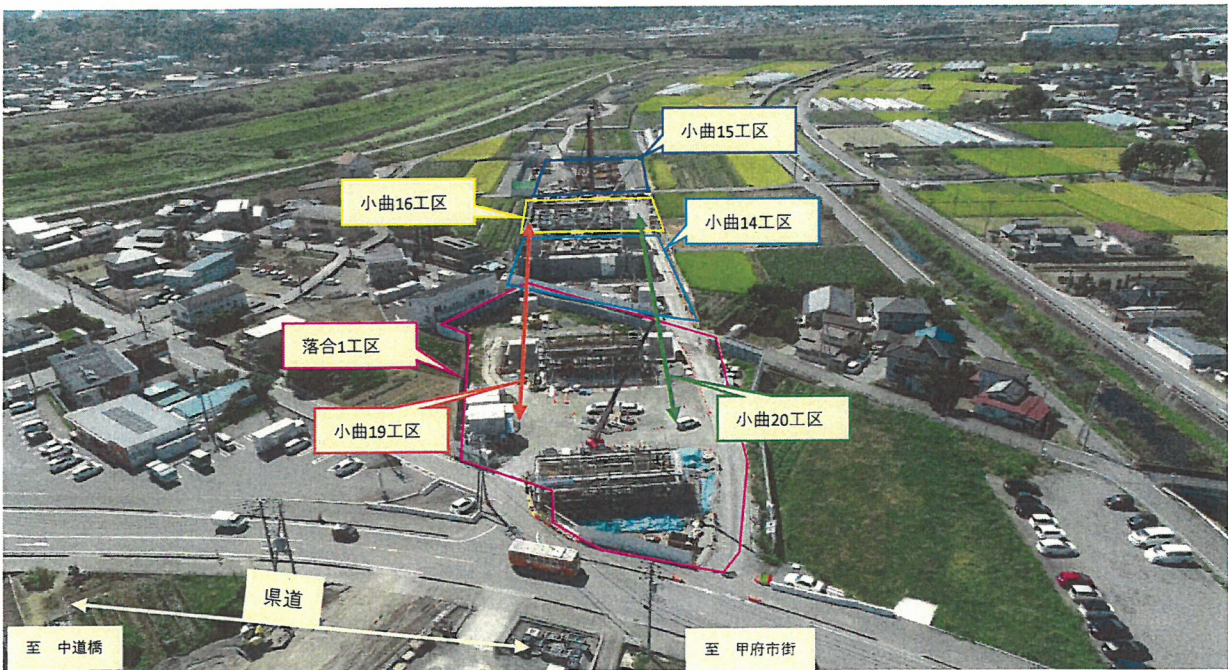

国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)(仮称)落合西ランプ橋梁下部工事(その1)
長田組土木・宏和建设共同企業体(小曲14工区)

国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)(仮称)落合西ランプ橋梁下部工事(その2)
大新工業・中村建設共同企業体(落合1工区)

国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)小曲高架橋(仮称)橋梁下部工事その2(一部債務)
国際建設株式会社(小曲16工区)

国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)小曲高架橋(仮称)橋梁下部工事その1(一部債務)
齋藤建設株式会社(小曲15工区)

国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)落合西オンランプ(仮称)橋梁上部工建設工事(一部債務)
株式会社早野組 (小曲19工区)

国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)落合西オフランプ(仮称)橋梁上部工建設工事(一部債務)
株式会社三枝組 (小曲20工区)

平成30年度


国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)

小曲高架橋(仮称)橋梁下部工事その1(一部債務)

地域住民のみなさまにおかれましては、日頃より工事へのご協力頂きありがとうございます。

工事の進捗状況についてお知らせ致します。現在、施工中の鋼管杭が10月上旬で終了し、10月中旬から鋼矢板打込みの施工が始まります。

工事施工中、地域住民のみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

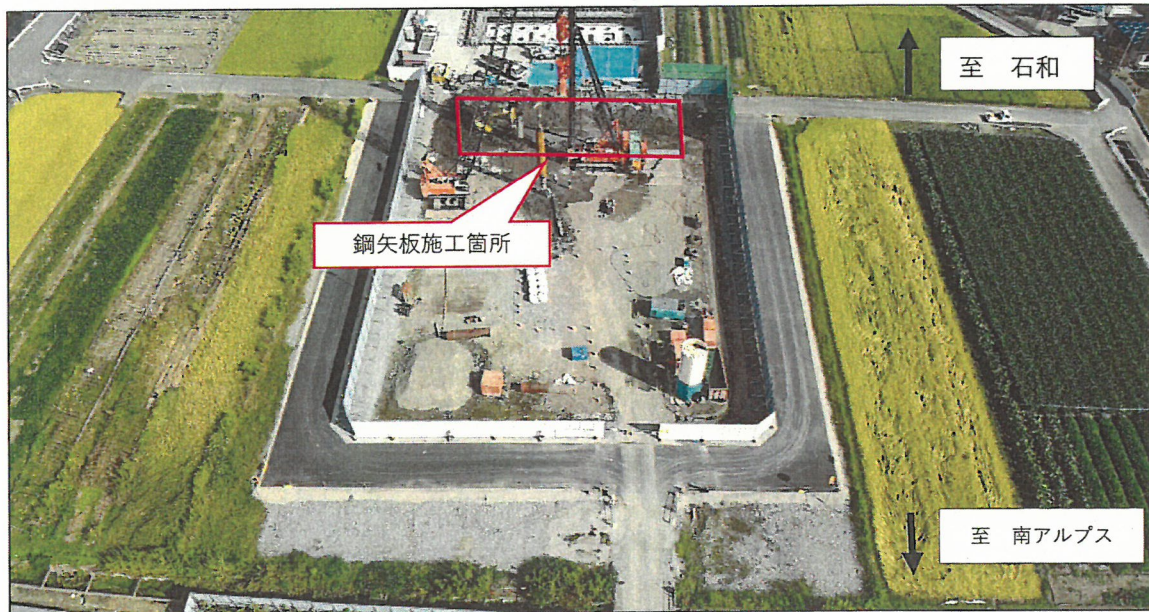

工 期：平成31年3月29日～令和元年1月31日

工 事 概 要：橋梁下部工事

逆T式橋台 H=11.0m V=1141m³ N=1基

鋼管杭 φ1000 L=8.0m N=48本

仮設工 1式

道路改良工事

地盤改良工事(中層混合処理工) V=6,877m³

工事進捗状況：9月末時点 44.2%



MARUBUN
SAITOH KENSETU

齋藤建設株式会社



現場代理人
小林 裕文


令和元年度

国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)

落合西オンランプ橋(仮称) 橋梁上部工建設(一部債務)

日頃より、地域住民のみなさまにおかれましては、工事へのご理解とご協力を頂きありがとうございます。

9月末現在、施工に向けての準備を行っています。準備が整い次第施工を行います。工事施工中は、安全第一で工期内完成を目指します。これからも引き続き宜しくお願いします。

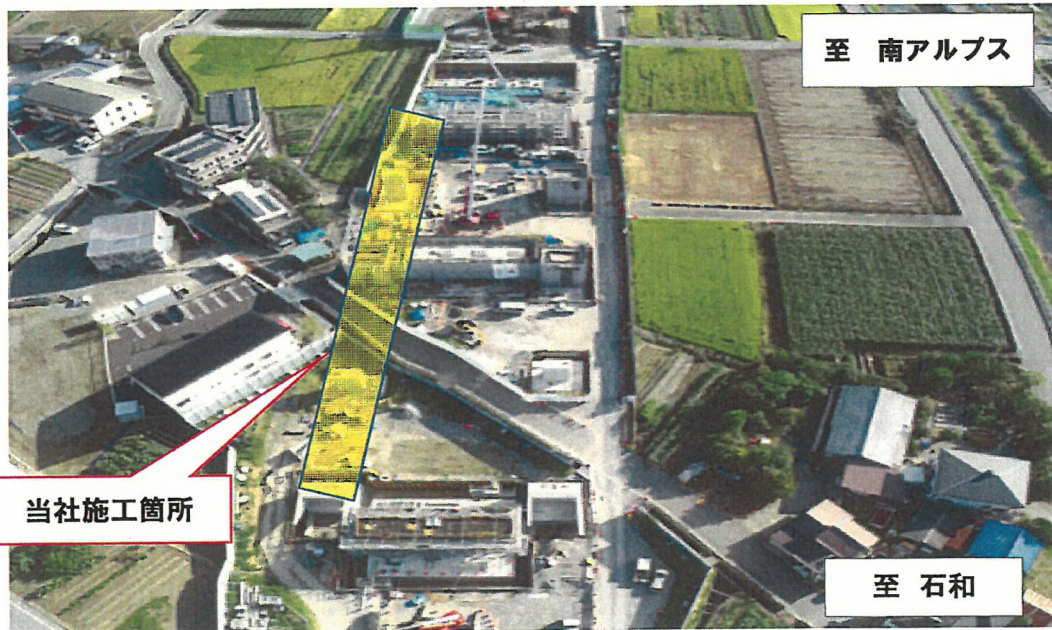

工 期 : 令和1年8月9日~令和2年5月29日

工 事 概 要 : PC4径間連続中空床版

L=99.0m W=5.5m (6.41m)

コンクリート V=379m³ PC鋼材 L=1578m

支承工 N=10個 橋梁付属物工 一式

落橋防止装置工

橋梁付属物工 一式

工事進捗状況 : 9月末時点 1.0%

現場代理人

井上 博路



HAYANO

真心と確かな技術
株式会社 早野組

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）落合西オフランプ橋（仮称）
橋梁上部工建設工事（一部債務）




日頃より、地域住民の皆様には、工事のご理解ご協力を
頂きありがとうございます。

9月末現在、施工に向けての準備を行っています。

準備が整い次第施工を行う予定です。

信頼に応える技術もとに安全施工を行ないますので、宜し
くお願いいたします。

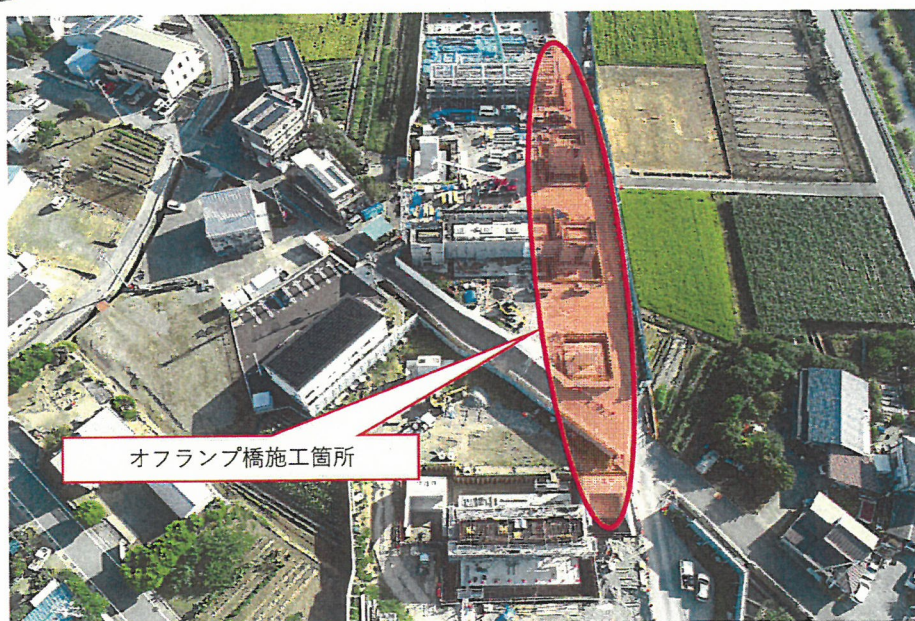

工 期：令和元年8月9日～令和2年5月29日

工 事 概 要：橋梁上部工

RC4径間連続中空床版橋 L=99.0m W=5.5m (6.41m)

コンクリート V=370m³ PC鋼材 L=1381m

支承工 N=10個 落橋防止装置工 N=2箇所

橋梁附属物工 一式

工事進捗状況：9月末時点 1.0%



株式会社 三枝組

現場代理人 相原 伸年
