

# 国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）

## 道路改良工事（一部債務）

（小曲町22工区）

日頃より、地域の皆様におかれましては工事へのご理解とご協力をいただきまして厚く御礼申し上げます。

現在、小曲22工区では、盛土工と補強土壁工を施工しております。  
前回まで施工していた車道用のカルバートは、4月下旬に完成し、通行可能となりました。  
また、水路用のカルバートも完成しました。ご協力ありがとうございました。  
安全第一で1日も早い工事の完成を目指してまいりますので、今後ともご協力の程をよろしくお願いいたします。


工期 令和元年9月10日～令和2年11月13日

工事概要 道路改良工事 L=251m

盛土工 V=55,500m<sup>3</sup> 地盤改良工(中層混合処理工) V=2,302m<sup>3</sup>

補強土壁工 H=2.4～4.2m A=130m<sup>3</sup> カルバート工 N=2基

工事進捗率 43.7%(4月末日)

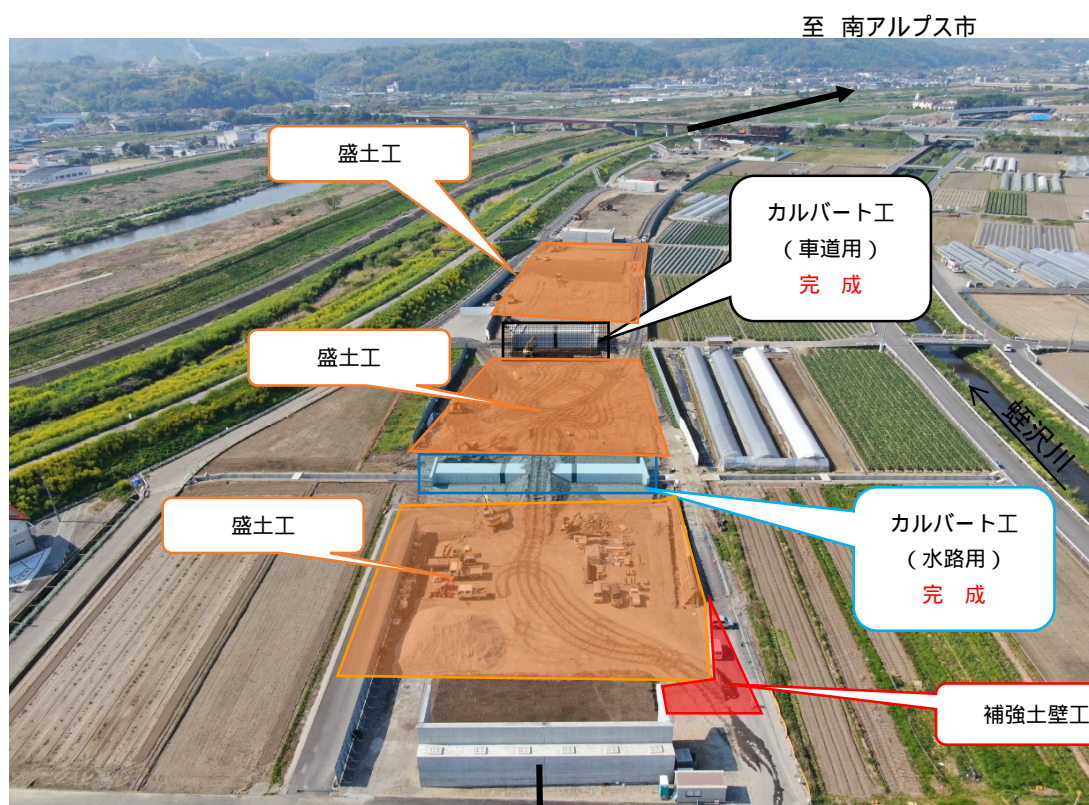

長田組土木株式会社

至 笛吹市

TEL:055-231-1111(代表)

TEL:055-231-1093(土木部直通)

現場代理人:相馬 英人


# 国道140号（新山梨環状道路東部区間1期） 道路改良工事その1（一部債務）



日ごろより、山梨県の道路事業にご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。  
この度、甲府市小曲町地内にて新環状道路建設を行っております。

車両の通行等、皆様方には何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、工事関係者一同鋭意努力し、騒音・災害防止・交通安全等に細心の注意を払う所存です。  
どうぞよろしくお願い致します。

上空より撮影(令和2年4月27日現在)

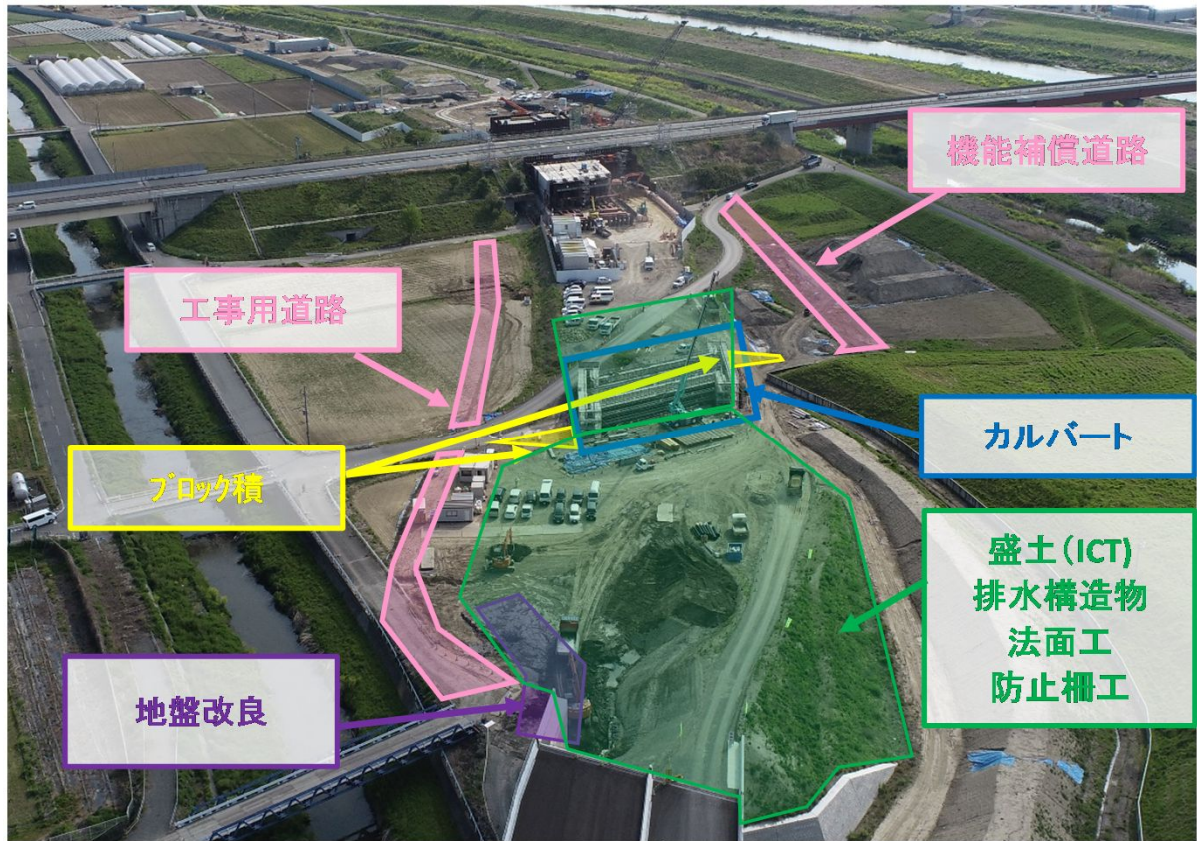

工期	:	令和元年 12月 24日	～	令和 3年 1月 20日
主な工事概要	:	路体盛土工 V=24,800m <sup>3</sup>	路床盛土工 V=3,500m <sup>3</sup>	
		地盤改良工 V=2,206m <sup>3</sup>	補強土壁工 A=207m <sup>2</sup>	
		カルバート工 n=1基	仮設工 一式	
工事進捗状況	:	令和 2年 4月末時点	20.4%	
受注者	:	株式会社 早野組		
		現場代理人 望月 慶介		



真心と確かな技術

株式会社 早野組



# 国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 道路改良工事その2(一部債務)

新緑が目にあざやかな季節になりましたが、お健やかに過ごしてでしょうか。今はコロナが終息することを望むばかりですが、地域の皆様方におかれましても体調管理には十分お気をつけ下さい。

現在、当工事においては盛土箇所における軟弱地盤の改良作業を行っています。5月中に地盤改良を完了させ、6月から場所打函渠の作業に入っていく予定です。まだまだ、工事序盤ではありますが、早期完了するべく最善を尽くしますので何卒ご協力のほどよろしくお願い致します。

【 上空からドローンにて現場を撮影 】



## 工事概要

道路改良工事 L=411m  
盛土工 V=50,420m<sup>3</sup>  
地盤改良工 V=5,392m<sup>3</sup>  
補強土壁工 A=174m<sup>2</sup>  
場所打函渠工 N=1箇所  
仮設道路工 1式

## 工期

令和 1年12月24日  
～令和 3年 3月15日

工事進捗率 12%(4月末時点)



齋藤建設株式会社

山梨県甲府市青沼二丁目11-22 TEL 055-233-910 FAX 055-233-6382

# 国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 西下条本線橋(仮称) 橋梁工事 (一部債務)


平素より新山梨環状道路建設工事に当たり、皆様方のご理解ご協力ありがとうございます。

本工事は5月中旬より場所打杭工事の準備に取り掛かせて頂きます。準備が整い次第、場所打杭の施工に移行してまいります。

工事期間中は地域住民の皆様には何かとご迷惑をおかけいたしますが安全第一で早期完成を目指してまいります。引続き、ご理解・ご協力をお願い致します。

## ● 工事概要

プレテンション方式高強度PC床版橋 L=18.0m W=18.25m  
逆T式橋台 N=2基 H=9.2m  
場所打杭基礎  $\phi$ 1200 L=31.5~32.0m N=34本

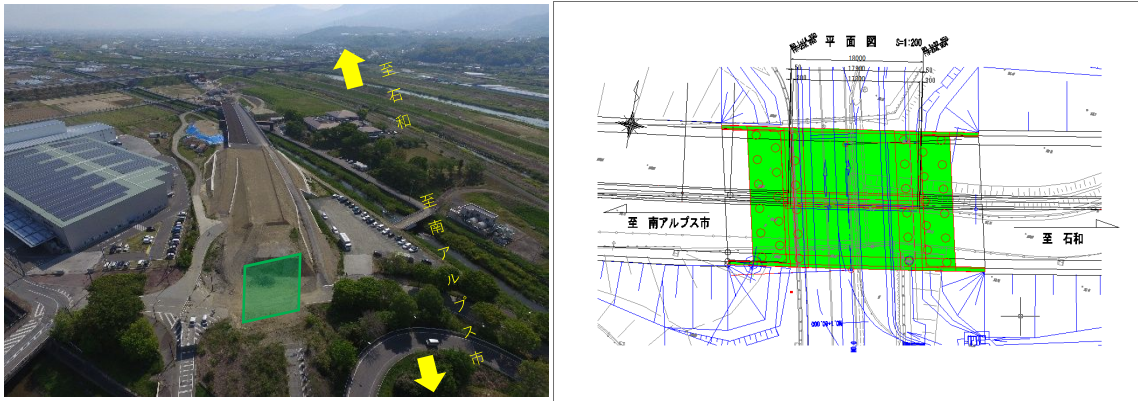

工期：令和 2年 2月26日 ~ 令和 3年 3月15日


施工会社

国際建設・望月組土木 国道140号(新山梨環状道路)西下条本線橋工事共同企業体



# 国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 法面植栽工事(明許)

日頃より、地域住民の皆様におかれましては、工事へのご理解とご協力を頂き誠にありがとうございます。工事施工中は安全第一で工期内完成を目指します。これからも引き続きご協力をお願いいたします。

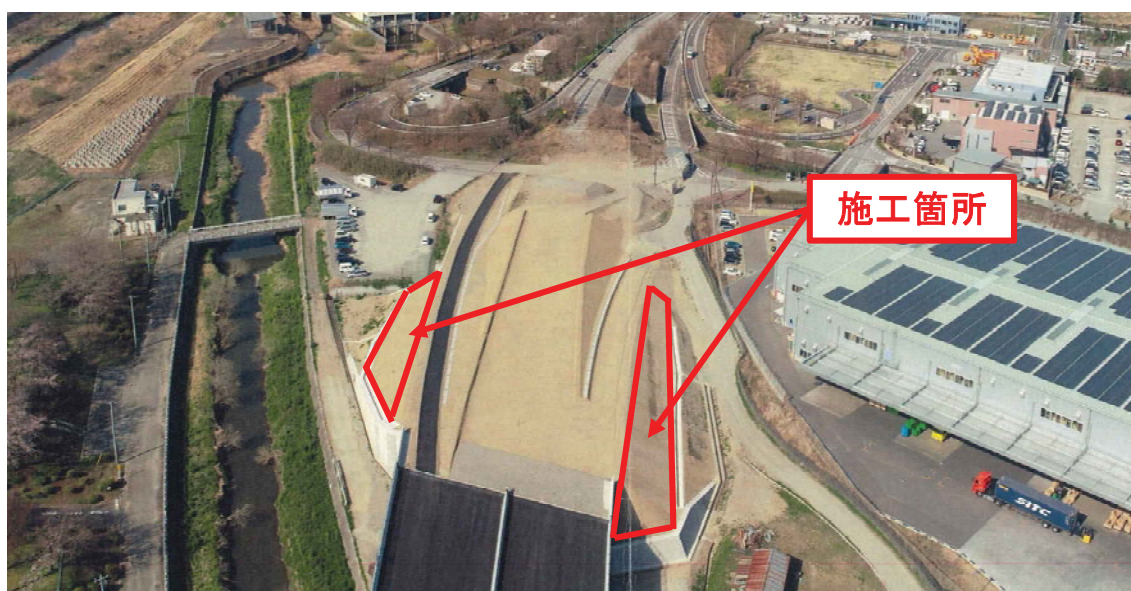

工期 : 令和2年3月6日～令和2年7月31日

工事概要 : 法面植栽工  
植生シート工 A=1,880㎡  
植栽工 N=2,795本

工事進捗率 : 0% (今月より着手いたします)

施工会社 : 中央造園土木株式会社  
山梨県甲府市徳行一丁目9番27号  
TEL 055-226-4525  
FAX 055-226-4573

現場代理人 : 今村 尚人
